

# PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

## III DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA

### IV SERVIZIO "EDILIZIA E MANUTENZIONE"

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEGLI  
IMPIANTI ALLE NORME DI IGIENE E  
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO DEL  
LICEO SCIENTIFICO ARCHIMEDE DI ACIREALE

ELABORATO

**R06a**

OGGETTO:

PIANO DI SICUREZZA

SCALA

DATA

Novembre 09



PROGETTISTA E  
COORDINATORE DELLA SICUREZZA

**Ing. Orazio Urso**

visti e/o approvazioni

Comune di ACIREALE

CATANIA

## PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

### 1<sup>a</sup> parte – Relazione generale

DOCUMENTO  
ELABORATO AI SENSI DELL'ART. 100 DEL  
D. LGS. 81/2008 E CON I CONTENUTI MINIMI PREVISTI  
ALL'ALLEGATO XVI

PSC elaborato per la realizzazione di “Lavori di manutenzione”

per conto della  
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

presso il LICEO SCIENTIFICO STATALE “ARCHIMEDE”

sito in  
ACIRELE VIA LUDOVICO ARIOSTO

Il Committente

Il Responsabile dei Lavori

Il Coordinatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'Impresa

\_\_\_\_\_

		Emissione	Verifica	Approvazione
Descrizione Revisione	Data			
I Emissione	Novembre 2009			

## 1. PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo all'applicazione della sicurezza nel cantiere, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, per i lavori riportati in testata, costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha lo scopo di delineare e sintetizzare le norme che devono essere osservate, per svolgere in condizioni di sicurezza, le attività all'interno del cantiere e realizzare così un'efficace piano di protezione fisica per i lavoratori impegnati.

Il Committente attraverso la redazione di questo PSC, stilato con i contenuti minimi dell'Allegato XV del suddetto decreto e redatto da professionista abilitato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008, assolve ai compiti previsti dall'art. 91, comma 1, lettera a) e b) del D. Lgs. 81/2008 e con i contenuti minimi previsti all'Allegato XV del suddetto Decreto.

L'impresa aggiudicataria dei lavori è tenuta ad attuare quanto previsto nel presente PSC e dovrà inoltre predisporre un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) che dovrà avere le caratteristiche di un piano complementare di dettaglio di questo PSC.

L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare proposte di integrazione a questo PSC ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori nel cantiere.

Le eventuali proposte di modifica devono essere presentate al Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori che ha il compito di valutare, discutere ed approvare tali, eventuali, proposte.

Il Committente, prima dell'affidamento dell'incarico dei lavori, designerà anche un professionista abilitato quale Coordinatore per l'esecuzione dei lavori cui spettano i poteri e gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008.

Oltre all'impresa aggiudicataria tutte le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che prestano la propria attività all'interno del cantiere, a qualsiasi titolo, sono tenute, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, alla redazione di un proprio POS.

Per la stesura del presente piano di sicurezza sono state rispettate tutte le disposizioni di legge riguardanti la materia di prevenzione infortuni con particolare attenzione alle disposizioni riportate nei:

- D. Lgs. N° 81 del 9 Aprile 2008
- D. Lgs. N° 163 del 12 aprile 2006
- Tutte le disposizioni di legge non contemplate nel suddetto Decreto.

Gli organi preposti al controllo, alla prevenzione degli infortuni ed al pronto intervento in caso di incidenti saranno:

*Ispettorato del Lavoro*  
*A.S.L. (Azienda sanitaria locale)*  
*I.N.A.I.L.*  
*VV.FF.*  
*Pronto Soccorso, Presidio Ospedaliero*  
*Carabinieri*  
*Polizia*

Gli organi sopracitati saranno quelli competenti per il territorio ove avrà luogo la realizzazione dell'opera prevista in progetto, oltre ad altri organismi citati più innanzi.

Le presenti istruzioni non intendono pregiudicare né sostituirsi in alcun modo alle vigenti disposizioni di legge le cui norme e regole devono essere comunque applicate durante lo svolgimento del contratto in essere.

Sarà cura del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dell'opera provvedere inoltre alla compilazione di una tabella da apporre in cantiere e di immediata consultazione con i recapiti degli organi sopracitati (v. esempio sottoportato).

## Telefoni ed Indirizzi Utili

Carabinieri	112
Polizia	113
Comando dei Vigili Urbani (Municipio)	
Pronto Soccorso	118
Guardia Medica	
Vigili del Fuoco VV.F.	115
ASL territoriale	
Ospedale	
INAIL	
Ispettorato del Lavoro	
Acquedotto (segnalazione guasti)	
Elettricità ENEL (segnalazione guasti)	16441

## 2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

I criteri di valutazione dei rischi riportati nel presente documento sono stati rilevati e desunti esaminando i seguenti elaborati:

- Progetto esecutivo delle opere da realizzare
- Elaborati contabili
- Calcoli strutturali
- Relazione geologica

Il presente PSC sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro nei cantieri temporanei o mobili, propone i seguenti contenuti minimi previsti dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008:

- modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni (v. schede);*
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;*
- c) servizi igienico-assistenziali;*
- d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;*
- e) viabilità principale di cantiere;*
- f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;*
- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;*
- h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;*
- i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;*
- l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;*
- m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;*
- n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;*
- o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;*
- p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;*
- s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;*
- t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.*

Oltre a quanto sopraddetto vengono riportate:

- Valutazione del n° di imprese presunto in cantiere;*
- Descrizione di massima delle fasi lavorative;*

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

*Valutazione di eventuali sovrapposizioni delle suddette fasi nelle stesse aree lavorative;*  
*Misure di sicurezza specifiche e complementari derivanti dalle sovrapposizioni individuate;*  
*Attribuzione di ruoli e competenze in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro;*  
*Descrizione del cantiere*  
*Descrizione dei lavori e delle attrezzature e materiali da utilizzare;*  
*Misure di sicurezza da attuare in modo da eliminare le situazioni a rischio;*

La valutazione dei rischi per l'esecuzione dei lavori sarà eseguita considerando le seguenti possibilità di infortuni (lista non esaustiva):

Caduta di persone in piano per l'eventuale presenza sulle vie di transito di materiali di ingombro, di buche, di avvallamenti o di sostanze scivolose;  
Caduta di persone dall'alto durante le fasi di montaggio di ponteggi metallici e di realizzazione delle varie opere in elevazione nell'impiego di scale a mano;  
Caduta di persone nello scavo durante i lavori di sbancamento e di esecuzione delle fondazioni;  
Investimento per caduta di materiali dall'alto durante la fase di carico, scarico, movimentazione e sollevamento dei materiali e durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisorie;  
Seppellimento e/o soffocamento per smottamento delle pareti o irruzioni d'acqua nei lavori di sbancamento e scavo;  
Schiacciamento per ribaltamento dei mezzi meccanici per cedimento del terreno o per irrazionale utilizzazione dei mezzi stessi;  
Urto di persone contro i mezzi operanti in cantiere, tra mezzi e strutture fisse contro ostacoli;  
Investimento di persone da mezzi operanti in cantiere;  
Ferite da taglio e da schiacciamento per l'impiego di utensili ed attrezzi vari e per il maneggio di materiali;  
Strappi muscolari per l'irrazionale maneggio e sollevamento manuale dei materiali;  
Investimento da spruzzi di materiale negli occhi durante l'operazione di getto, intonacatura e di travaso;  
Investimento e proiezioni di schegge durante l'impiego di apparecchiature per il taglio nei lavori di smerigliatura e scannellatura;  
Punture per l'eventuale presenza di punte o chiodi sulle vie di transito per il maneggio di materiali scheggiabili e/o sfaldabili;  
Inalazione di polveri nei lavori di scavo, trasporto del materiale scavato, nonché in occasione della preparazione delle aree di lavoro e delle pulizie di apparecchiature e mezzi operativi;  
Ferite dovute all'impiego di attrezzature e utensili deteriorati;  
Ferite o fratture per contatto con organi di trasmissione del moto di macchinari ed impianti o per movimenti s coordinati sconnessi;  
Ferite per contatto con gli organi lavoratori delle macchine e degli impianti utilizzati;  
Ferite, cesoiamenti e contusioni dovute alla movimentazione dei materiali con mezzi di sollevamento che utilizzano brache;  
Danno all'apparato uditivo da rumore provocato da macchinari ed utensili utilizzati in cantiere;  
Danni all'apparato uditivo e/o visivo da vibrazioni e scuotimenti derivanti dall'impiego di martelli demolitori, vibratori, ecc.;  
Folgorazione per contatti diretti ed indiretti in conseguenza dell'utilizzo di macchine ed apparecchiature elettriche e per eventuali avvicinamenti a parti in tensione;  
Danno per contatto o inalazione di sostanze pericolose o nocive alla salute dei lavoratori (oli minerali, disarmanti, cemento bitume, ecc.);  
Danno per radiazioni caloriche, ultraviolette o ionizzanti derivanti dai lavori di saldatura;  
Danno per inalazione di gas e fumi che si sprigionano durante i lavori di saldatura;  
Ustioni provocate da lavoro di saldatura;  
Ustioni per scoppio di recipienti contenenti gas compressi (Bombole d'ossigeno, acetilene, compressori, ecc.);

Ustioni da incendio per la presenza in cantiere di sostanze infiammabili;  
Elettrocuzione e/o ustioni per caduta di fulmini sulle strutture metalliche esistenti;  
Le suddette possibilità d'infortunio possono essere maggiormente cagionate dalla cattiva organizzazione del lavoro ed in particolare per:  
Lavorazioni eseguite in posizione disagiata per la presenza di acqua, umidità, spazi ristretti o posizioni scomode in genere;  
Interferenza delle lavorazioni causate dalla concomitanza di più ditte nello stesso momento.

### 3. DATI GENERALI

Il presente capitolo riporta i dati generali dell'appalto relativo al presente PSC e la modalità di individuazione del numero di uomini x giorno presenti in cantiere.

#### 3.1 *Dati generali dell'opera*

**NATURA DELL'OPERA:**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE"

**COMMITTENTE:** PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

**Indirizzo del cantiere:** VIA LUDOVICO ARIOSTO ACIREALE - CATANIA

#### **DATI SOGGETTI COINVOLTI**

Responsabile dei Lavori	
Coordinatore per la Progettazione	ING. ORAZIO URSO
Coordinatore per la Esecuzione	ING. ORAZIO URSO

#### **DATI PROGETTISTI**

:	
Nome e Cognome	Ing. Orazio Urso
Indirizzo	Via Sciare Spoto N° 4 95025 Aci S. Antonio Catania
Note	

### 4. DESCRIZIONE DELL'OPERA

Riportare qui una descrizione dell'opera oggetto dell'appalto

#### 4.1 *Impatto ambientale a seguito dell'insediamento del cantiere*

Nelle zone dove dovranno essere eseguiti i lavori occorrerà attuare tutti i possibili accorgimenti e precauzioni in modo da arrecare il minor fastidio possibile all'ambiente esterno.  
In linea di massima le misure che dovranno essere attuate a causa della presenza dei cantieri sono di seguito descritte:

a) *Viabilità e macchine semoventi*

Per gli automezzi utilizzati per il trasporto dei materiali lungo le strade urbane e di collegamento  
Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

saranno adoperate tutte le precauzioni necessarie per arrecare il minor disagio quali: la copertura del carico onde prevenire eventuali cadute del carico trasportato; divieto di utilizzare gli avvisatori acustici ad eccezione di casi particolari quale segnalazioni per le operazioni di carico e scarico, ecc.;

Le aree del cantiere, in considerazione della presenza aree limitrofe di persone non addette ai lavori, dovranno essere meticolosamente recintate con barriere dell'altezza necessaria (non inferiore a 2 m).

#### *b) Rumorosità*

Tutte le macchine utilizzate per i lavori, quali ad esempio quelle per movimenti terra (escavatori, pale meccaniche, ecc.), compressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, ecc. dovranno essere del tipo silenziato e di moderna concezione, con marmitte perfettamente efficienti.

Per la salvaguardia della salute dei lavoratori il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rumore al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo, per attuare le misure preventive e protettive, se necessarie.

A tale fine si deve misurare l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep, d) ovvero quella settimanale (Lep, w) se quella quotidiana risulta variabile nell'arco della settimana.

La valutazione deve essere effettuata da personale competente ad intervalli opportuni, con la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.

Nel caso di variazioni degli impianti, macchine e/o delle lavorazioni, queste rilevazioni devono essere effettuate nuovamente.

Il rapporto contenente l'indagine fonometrica e indicante i criteri, i metodi, le strumentazioni, le modalità e il personale tecnico competente, deve essere messo a disposizione degli organi di vigilanza e redatto secondo quanto previsto al Capo II – “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” del D. Lgs. 81/2008.

In merito alla valutazione del rumore, l'art. 189 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 cita testualmente che: *“Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:*

*a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.”*

#### *c) Inquinamento*

Tutti i materiali di risulta provenienti da scavi, perforazioni, scarto delle lavorazioni e quant'altro, dovranno essere condotti in discariche autorizzate.

Eventuali rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate secondo la vigente normativa.

Le macchine con motore a combustione interna quali escavatori, pale meccaniche, autocarri, gruppi elettrogeni, compressori, ecc. dovranno essere dotati di efficiente marmitta, e di revisione periodica del motore, in modo da limitare il più possibile l'immissione nell'atmosfera di gas inquinanti.

Dovrà essere posta particolare attenzione affinché a causa dei lavori e del circolare delle macchine non venga sollevata polvere che possa arrecare disagio agli operai ed a terzi, ed a tal fine il cantiere si attrezzerà opportunamente in modo da inumidire periodicamente il suolo per eliminare del tutto l'inconveniente soprattutto nelle stagioni più asciutte.

## **4.2 Condizioni ambientali particolari**

È notorio che in questo settore di attività le operazioni produttive vengono svolte senza carattere di ripetitività, infatti in fase di realizzazione, lavorazioni, situazioni, procedimenti, azioni sono sempre diversi, sia da cantiere a cantiere, per le caratteristiche intrinseche al diverso prodotto finale, sia,

nello stesso cantiere, per l'evolversi delle categorie di lavoro in relazione alle diverse fasi di installazione.

Anche l'ambiente esterno in cui si opera, con il mutare delle stagioni e delle condizioni meteorologiche, la dispersione dei posti di lavoro, la diversità dei luoghi e delle relative condizioni ambientali circostanti, le distanze dalle fonti di approvvigionamento, sono elementi a cui corrispondono diverse tonalità di rischi provenienti dall'esterno che debbono comunque essere evidenziate nel presente documento.

A tal fine si dispone che in fase di esecuzione dell'opera debba tenersi conto di ulteriori specifiche dipendenti dalle mutanti condizioni di cantiere e si dispone che il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori prenda provvedimenti segnalando alle imprese coinvolte nell'appalto eventuali sorgenti di rischio aggiuntive con le relative prescrizioni atte a contenere i rischi stessi.

#### **4.3            *Coordinamento delle misure di prevenzione tra le varie imprese***

In funzione della presenza contemporanea di più imprese operanti all'interno del cantiere, va previsto il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione per la salvaguardia dei lavoratori.

In tal senso il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre a provvedere ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano, dovrà organizzare la comunicazione tra le varie imprese nonché la loro reciproca informazione.

In questo senso il coordinatore per l'esecuzione dovrà disporre le opportune riunioni preliminari con le imprese ed i lavoratori autonomi ed informare di eventuali modifiche sul programma lavori mediante comunicazioni scritte.

Si cercherà comunque, come si evince dal diagramma di Gantt allegato, di procedere per fasi lavorative successive, per ridurre al minimo indispensabile le sovrapposizioni e quindi di evitare la contemporanea presenza, nelle sottoaree di lavoro in cui si è suddiviso il cantiere, di lavoratori di imprese diverse che svolgano attività diverse.

#### **4.4            *Viabilità***

In questo paragrafo verranno prese in esame le zone lungo il tracciato che, durante la realizzazione dell'opera, saranno interessate da interventi costruttivi che potrebbero interferire con la ordinaria viabilità e pertanto necessiterebbero di particolari interventi di regolamentazione del traffico.

Al fine di ridurre al minimo le interferenze dei mezzi d'opera con il traffico ordinario si individueranno percorsi ottimali per raggiungere e smistare i mezzi d'opera presso il cantiere di lavoro.

### **5.        *INDIVIDUAZIONE DELLE AREE***

In questo capitolo saranno individuate puntualmente sia le aree di cantiere che per la peculiarità delle lavorazioni insite all'interno delle stesse possono essere definite in maniera univoca, che le singole fasi operative in cui è stato suddiviso il progetto.

In tale modo si ha una visione dettagliata delle lavorazioni e dei luoghi in cui le stesse saranno effettuate, al fine di evitare, almeno in fase progettuale, sovrapposizioni di operazioni temporali e logistiche.

#### **5.1            *Individuazione delle aree operative di lavoro***

Per una buona individuazione e settorizzazione delle tipologie di rischio individuabili in un cantiere di lavoro edile, è necessario individuare delle aree di cantiere ove si svolgeranno attività ben

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania



definite o dove sono presenti condizioni ambientali particolari per cui potrebbe essere necessario prevedere misure di sicurezza aggiuntive.

Queste aree, cui si assoceranno in seguito le varie fasi lavorative di competenza, potrebbero di volta in volta intersecarsi o sovrapporsi dando luogo ad una sovrapposizione di misure di sicurezza tali da garantire il lavoratore nell'ambito dell'attività svolta in quel momento.

Nella fattispecie, per le opere in progetto, si andranno a definire le seguenti aree omogenee d'attività, per singolo cantiere:

## **5.2 Individuazione delle fasi operative**

Per ognuna delle aree operative di cantiere prima definite, si andranno ad individuare tutte le fasi operative in cui si è suddiviso il progetto, necessarie alla realizzazione dell'opera ed indicate nel diagramma di Gantt allegato al presente piano.

Nella tabella sottoriportata sono anche indicate le schede di sicurezza correlate alla fase corrispondente e riportate nell'appendice delle schede.

N°	Descrizione Fasi Operative	Schede Sicurezza Correlate
1	Incantieramento In questa fase lavorativa si prevede il montaggio delle attrezzature e baracche di cantiere.	
2	Installazione baracche	FO.IN.001 FO.IN.008 ATTREZ004 ATTREZ024 AE002
3	Installazione di macchine operatrici	FO.IN.006 FO.IN.007 ATTREZ004 ATTREZ003 ATTREZ011 AE002 AE003
4	Demolizioni Demolizione di fabbricati esistenti	FO.DE.001 FO.DE.021 ATTREZ002 ATTREZ057 AE002
5	Scavi In questa fase si prevede l'esecuzione di scavi e rinterri	ATTREZ001 ATTREZ019 AE020
6	Fondazioni in c.a. La presente fase prevede opere di fondazione in c.a. (platee, travi rovesce).	
7	Montaggio barre di armatura	ATTREZ032 AE013 AE014
8	Montaggio carpenteria	SP133 ATTREZ004 ATTREZ031 AE009

9	Getto calcestruzzo	ATTREZ022 AE007
10	Struttura in acciaio Realizzazione di struttura portante in profilati d'acciaio.	FO.ST.001 ATTREZ008 AE012
11	IMPIANTI ELETTRICI	
12	Posa cavi elettrici	FO.EL.003 FO.EL.004 FO.EL.011 FO.EL.012 ATTREZ017 ATTREZ097 AE002 AE030
13	Posa apparecchiature di comando	FO.EL.004 FO.EL.011 FO.EL.002 ATTREZ017 ATTREZ097 AE030
14	Montaggio quadri elettrici	FO.EL.011 FO.EL.001 FO.EL.013 ATTREZ017 ATTREZ097 AE002 AE030
15	Impianto di terra	FO.EL.011 FO.EL.012 FO.EL.008 ATTREZ017 ATTREZ097 AE030
16	IMPIANTI BASSA TENSIONE	
17	Impianti citofonici	FO.EL.004 FO.EL.007 FO.EL.010 ATTREZ017 ATTREZ097 AE002 AE030
18	IMPIANTI IDRAULICI	
19	Posa tubazioni	FO.ID.002 FO.ID.003 ATTREZ017 ATTREZ055 AE002 AE030
20	Montaggio pezzi sanitari	FO.IS.008 FO.IS.011

		FO.IS.012 ATTREZ004 ATTREZ017 ATTREZ038 AE002 AE030
21	RIFACIMENTO FACCIATA	
22	Montaggio ponteggi	ATTREZ108 ATTREZ112 ATTREZ115 ATTREZ118 AE002 AE003 AE028
23	MONTAGGIO INFISSI	FO.IF.001 FO.IF.006 FO.IF.013 SP185 ATTREZ003 ATTREZ097 ATTREZ098 AE002

Nella seguente tabella sono riportati gli intervalli temporali di svolgimento delle singole fasi, il numero di giorni lavorati, l'impresa e la zona relative alla fase corrispondente.

N°	Descrizione Lavori FASI	PERIODI PREVISTI			Impresa	Zona
		Inizio	Fine	N°gg		
1	1 Incantieramento In questa fase lavorativa si prevede il montaggio delle attrezzature e baracche di cantiere.					
2	1.1 Installazione baracche					
3	1.2 Installazione di macchine operatrici					
4	2 Demolizioni Demolizione di fabbricati esistenti					
5	3 Scavi In questa fase si prevede l'esecuzione di scavi e rinterri					
6	4 Fondazioni in c.a. La presente fase prevede opere di fondazione in c.a. (platee, travi rovesce).					
7	4.1 Montaggio barre di armatura					
8	4.2 Montaggio carpenteria					
9	4.3 Getto calcestruzzo					
10	5 Struttura in acciaio Realizzazione di struttura portante in profilati d'acciaio.					
11	6 IMPIANTI ELETTRICI					
12	6.1 Posa cavi elettrici					
13	6.2 Posa apparecchiature di comando					
14	6.3 Montaggio quadri elettrici					
15	6.4 Impianto di terra					
16	7 IMPIANTI BASSA TENSIONE					
17	7.1 Impianti citofonici					
18	8 IMPIANTI IDRAULICI					
19	8.1 Posa tubazioni					
20	8.2 Montaggio pezzi sanitari					
21	9 RIFACIMENTO FACCIATA					
22	9.1 Montaggio ponteggi					
23	10 MONTAGGIO INFISSI					

## 6. SORVEGLIANZA E PRESIDIO SANITARI

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal “Medico Competente” nei casi previsti dalla vigente normativa ai sensi della sezione V del D. Lgs. 81/2008.

Oltre a quanto già indicato nella esposizione degli indirizzi del D. Lgs 81/2008 è da rilevare che i controlli prevedono, ai sensi dell’art. 45 del suddetto Decreto:

*visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*

*visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;*

*visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;*

*visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;*

*visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Il medico competente deve compilare una cartella sanitaria per ogni lavoratore; essa viene custodita presso il datore di lavoro con la garanzia del rispetto del segreto professionale.*

Il medico competente fornisce ai lavoratori ogni informazione circa gli accertamenti sanitari a cui deve sottoporsi, li informa dei risultati e rilascia loro, a richiesta, copia della documentazione sanitaria; effettua inoltre visite mediche, a richiesta dei lavoratori, quando queste siano giustificate da rischi professionali.

Nel caso in cui il medico competente accerti la non idoneità del lavoratore a svolgere le sue mansioni, ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore; è possibile, entro trenta giorni, fare ricorso contro il giudizio di non idoneità alla struttura sanitaria pubblica competente per territorio.

Il medico competente può essere dipendente dell’azienda, libero professionista o anche dipendente di una struttura pubblica, purché non svolga compiti di controllo. Egli è il soggetto autonomamente preposto a dare attuazione ai contenuti della sorveglianza sanitaria fissando, sotto la sua responsabilità, protocolli mirati alla prevenzione dei rischi individuati.

Nelle lavorazioni che espongono all’azione di sostanze che possono essere nocive per inalazione o per contatto, gli addetti devono essere visitati da un medico competente prima di essere ammessi a tale tipo di lavoro per stabilire se abbiano o meno i requisiti di idoneità per espletare tali mansioni e rivisitati periodicamente per constatare il loro stato di salute.

Qualora la natura del lavoro edile non esponga a particolari rischi per la salute, ma si svolga in concomitanza ad altre attività industriali per le quali siano previsti accertamenti sanitari, anche i lavoratori edili devono essere sottoposti ad eguali accertamenti.

In edilizia le lavorazioni per le quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche sono normalmente le seguenti:

*Visita trimestrale* per categorie addette a lavori con prodotti contenenti arsenico, mercurio, piombo, benzolo, xilolo; tutte attività che riguardano in particolare i verniciatori.

*Visita semestrale* per tutti coloro che sono esposti al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, pece, paraffina, acetone, alcool, eteri; attività che riguardano ancora i verniciatori e gli impermeabilizzatori.

*Visita annuale* - e si tratta del caso più comune - per lavoratori che impiegano utensili ad aria compressa, quindi soggetti a vibrazioni e scuotimenti; esposti a inalazione di polvere di ossido di ferro; ad attività nelle gallerie e nelle fornaci di laterizi.

Dovrà inoltre essere effettuata da parte delle imprese coinvolte nell'appalto, un'opportuna valutazione di esposizione professionale agli agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, etc.) secondo quanto disposto al titolo VII del D. Lgs. 81/2008, per la salvaguardia della salute degli operai edili impegnati nelle varie fasi lavorative.

Come previsto al punto 5 dell'Allegato IV del D. Lgs. 81/2008, in cantiere dovrà essere presente una cassetta di presidi farmaceutici per risolvere i casi di pronto soccorso e dare le prime cure agli infortunati.

E' responsabilità dell'addetto alla sicurezza dell'impresa verificare che i medicinali contenuti nella cassetta siano ricambiati prima della scadenza e che siano integrati prima che finiscano, inoltre mensilmente l'addetto alla sicurezza deve compiere una ispezione nella cassetta dei medicinali per verificarne il contenuto e la validità.

## **7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI**

In questo capitolo vengono riportati gli obblighi delle figure coinvolte nell'appalto con i relativi riferimenti di legge sotto riportati

*RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs. N° 81 del 09 Aprile 2008*

Art. 90	Obblighi del committente o del responsabile dei lavori;
Art. 91	Obblighi del coordinatore per la progettazione;
Art. 92	Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
Art. 93	Responsabilità del committente o del responsabile dei lavori;
Artt. 20, 78	Obblighi dei lavoratori;
Art. 94	Obblighi dei lavoratori autonomi;
Art. 19	Obblighi del preposto;
Artt. 18, 96, etc	Obblighi dei datori di lavoro;
Art. 25	Obblighi del Medico Competente;

Che riassunti in via del tutto esemplificativa e non esaustiva sono di seguito descritti:

### ***Il committente o il responsabile dei lavori:***

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

#### ***Obblighi del coordinatore per la progettazione***

1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell' ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

***Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori***

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

***Obblighi del datore di lavoro***

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

### ***Obblighi dei lavoratori autonomi***

**1.** I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

In ottemperanza alle normative vigenti e considerato il tipo di attività svolta, in attuazione a quanto disposto dall'art. 18 e dalla Sezione VI del Decreto Legislativo n° 81/2008, bisognerà che l'impresa appaltatrice nomini una squadra per la gestione delle emergenze ed analogamente, all'interno del cantiere, dovrà essere predisposto il Servizio di Pronto Soccorso, nei casi e nelle modalità previsti dalla legislazione vigente, tenuto conto delle dimensioni del cantiere, dei rischi presenti e del parere del Medico competente.

Ai sensi dell'art. 104 comma 4 del suddetto Decreto è comunque previsto che *“i datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzino apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b)”*.

## **8. USO INDUMENTI PROTETTIVI**

Secondo quanto disposto al Capo II del D. Lgs. n° 81/2008, gli indumenti protettivi di uso individuale (DPI) vengono forniti ai lavoratori dalla Impresa, e ciascun dipendente dell'Impresa ha l'obbligo di usarli in modo adeguato e secondo le procedure di buona tecnica per proteggere la propria incolumità, adempiere a precise norme di legge ed esprimere compiutamente la propria professionalità; la consegna degli stessi sarà documentata mediante firme per ricevuta su appositi modelli predisposti dall'impresa stessa. L'elenco completo dei DPI, di cui si riporta un breve elenco non esaustivo, è contenuto all'Allegato VIII del D. Lgs. n° 81/2008.

### **a) - ELMETTO PROTETTIVO**

Serve a proteggere il capo da urti accidentali ed è obbligatorio indossarli all'interno del cantiere.

### **b) - TUTA DI LAVORO**

Viene indossata a protezione del corpo e per igiene personale, deve essere sempre indossata sul posto di lavoro e mantenuta in buon ordine.

### **c) - GUANTI IN PELLE E CROSTA DI CUIOIO**

Servono a proteggere le mani e le dita da abrasioni, escoriazioni, graffi, etc. Devono essere sempre usati durante l'esecuzione delle lavorazioni specifiche.

### **d) - SCARPE DI SICUREZZA**

Servono a proteggere da scivolamenti, cadute di materiali pesanti, trafitture di chiodi o di materiale appuntiti.

E' obbligatorio usarle in tutte le aree di lavoro.

### **e) - OCCHIALI PROTETTIVI E SCHERMI**

Servono a proteggere gli occhi da schegge, spruzzi accidentali, etc. Riportiamo solo alcune situazioni in cui l'uso degli occhiali è obbligatorio:

- dove è espressamente richiesto da procedure di impianti;
- durante la smerigliatura o taglio con flex;
- durante il taglio con cannello ossiacetilenico;
- durante qualsiasi lavorazione meccanica che genera trucioli;

### **f) - TAPPI ANTIRUMORE E/O CUFFIE**

Servono a proteggere l'udito dalla rumorosità, è obbligatorio il loro uso nei luoghi e nelle ore di lavoro indicata dall'apposita cartellonistica cioè nelle aree ad alta rumorosità (vicino a compressori, macchine centrifughe, etc).

### **g) - CINTURE DI SICUREZZA**

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania



Le cinture di sicurezza sono un mezzo di protezione individuale per i lavoratori che operano in posti di lavoro posti a quote superiori a m 2.00.

## 9. SEGNALETICA DI SICUREZZA, TARGHE, AVVISI

Si intende per:

Segnaletica di sicurezza: segnaletica che riferita ad una determinata macchina o situazione, trasmette mediante un colore od un segnale, un messaggio di sicurezza.

Avvisi: informazioni specifiche destinate ai lavoratori.

Targhe: indicazioni riferite a caratteristiche di una macchina, attrezzatura o manufatto.

*Obblighi del datore di lavoro*

Obbligo generale di informativa mediante affissione

Un obbligo generale ed espresso è previsto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 81/2008.

Tale norma stabilisce che *“quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.*

*Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.*

*Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell' ALLEGATO XXVIII”.*

*Segnaletica di sicurezza*

Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

L'efficacia della segnaletica dipende da un'estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali essa può risultare utile, per esempio nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, una esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), dovrà essere esposta una "segnaletica appropriata" In conformità agli Allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII e XXVIII del D.Lgs. n° 81/2008 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.

Colore	Significato o scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
	Pericolo - allarme	Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione, cautela Verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

In ogni caso la dimensione di un segnale dovrà rispettare la seguente formula:

$$A > l^2 / 2000$$

dove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in m<sup>2</sup> ed l la distanza in metri alla quale il segnale deve essere riconoscibile.

Il cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato.

I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all'All. XXV del D. Lgs. N°81/2008.

Le caratteristiche intrinseche dei cartelli variano a seconda che si tratti di:

#### *Cartelli di divieto*

- forma rotonda
- pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa

#### *Cartelli di avvertimento*

- forma triangolare
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero

#### *Cartelli di prescrizione*

- forma rotonda
- pittogramma bianco su fondo azzurro

#### *Cartelli di salvataggio*

- forma quadrata o rettangolare
- pittogramma bianco su fondo verde

#### *Cartelli antincendio*

- forma quadrata o rettangolare
- pittogramma bianco su fondo rosso

#### *Targhe*

- Nei locali destinati a deposito deve essere riportata, su una parete o in altro punto ben visibile, la "chiara indicazione" del carico massimo del solaio.
- Le scale aeree e i ponti mobili sviluppabili devono essere provvisti di targa indicante il nome del costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima.
- Per i motori con trasmissioni e macchine dipendenti, un "cartello indicatore" richiamante l'obbligo del segnale acustico di avvertimento dell'avviamento deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto.
- Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto un "cartello" indicante il diametro massimo della mola che può essere montata.
- Le mole abrasive devono portare un'"etichetta" con l'indicazione del tipo, qualità, diametro e velocità massima. Per le mole con diametro non superiore a 50 mm è ammessa la sostituzione dell'etichetta con un "cartellino di accompagnamento" anche cumulativo.
- Per le macchine per centrifugare, i limiti di velocità e di carico devono risultare da "apposita targa ben visibile" applicata sulla macchina.
- Sui mezzi di sollevamento e trasporto, la portata deve essere riportata mediante "apposita targa".
- Nei luoghi con impianti ad alta tensione deve essere indicata con "apposita targa" l'esistenza del pericolo di morte con "il contrassegno del teschio".
- I recipienti contenenti prodotti o materie pericolose o nocive devono portare una "scritta" che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni (Allegato XXVI).

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

### *Segnalazione di ostacolo*

La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini, pilastri lungo una via di passaggio, bozzelli di gru, oggetti di macchine, ecc., deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45° con percentuale del colore di sicurezza di almeno il 50% (All. XXVIII D. Lgs. 81/2008).



I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo visuale, all'ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico ed in posto ben illuminato.

I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità.

- Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o per i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere "adeguatamente segnalati".
- Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le misure di protezione devono essere munite di "apposite segnalazioni di pericolo".

### *Contrassegni per tubazioni e contenitori*

- Quando esistono più tubazioni o contenitori contenenti sostanze nocive o pericolose di cui alla legge n. 526/1974 e D.M. del 28 gennaio 1992, queste devono essere "contrassegnate con etichettatura o segnali previsti in punti visibili (All. XXVI, D.Lgs. n° 81/2008).

### *Avvisi, istruzioni per uso e modalità manovre*

Anche per segnali acustici (All. XXX, D.Lgs. n° 81/2008) e luminosi (All. XXIX, D.Lgs. n° 81/2008) sono indicate caratteristiche per garantire corretta percezione del messaggio:

- segnale luminoso continuo o intermittente = pericolo o urgenza;
- segnale acustico continuo = sgombero.






All'All. XXXI viene anche codificata la comunicazione verbale.

Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, come:

- via:	per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione
- alt:	per interrompere o terminare un movimento
- ferma:	per arrestare le operazioni
- solleva:	per far salire un carico
- abbassa:	per far scendere un carico
- avanti:	
- indietro:	
- a destra:	(se necessario, questi ordini andranno coordinati coi codici gestuali corrispondenti)
- a sinistra:	
- attenzione:	per ordinare un alt o un arresto d'urgenza
- presto:	per accelerare un movimento per motivi di sicurezza

All'All. XXXII vengono invece codificate le prescrizioni dei segnali gestuali. Viene precisato che il segnalatore deve essere facilmente individuabile per vestiario o elementi di riconoscimento evidenti.

<p>Inizio Attenzione Presa di comando</p>	<p>Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, il palmo delle mani rivolto in avanti</p>	
<p>Alt Interruzione Fine del movimento</p>	<p>Il braccio destro è teso verso l'alto, con il palmo della mano destra rivolta in avanti</p>	
<p>Fine delle operazioni</p>	<p>Le due mani sono giunte all'altezza del petto</p>	
<p>Sollevare</p>	<p>Il braccio destro, teso verso l'alto, con il palmo della mano destra rivolto in avanti, descrive lentamente un cerchio</p>	
<p>Abbassare</p>	<p>Il braccio destro, teso verso il basso, con il palmo della mano destra rivolto verso il corpo, descrive lentamente un cerchio</p>	
<p>Distanza verticale</p>	<p>Le mani indicano la distanza</p>	

Avanzare	Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro, gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo	
Retrocedere	Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti, gli avambracci compiono movimenti lenti che si allontanano dal corpo	
A destra rispetto al segnalatore	Il braccio destro teso, lungo orizzontale, con il palmo della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione	
A sinistra rispetto al segnalatore	Il braccio sinistro teso, lungo orizzontale, con il palmo della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione	
Distanza orizzontale	Le mani indicano la distanza	
Pericolo Alt o arresto di emergenza	Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti	
Movimento rapido	I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità	
Movimento lento	I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente	

Questo era anche previsto esplicitamente nelle norme di prevenzione in vari articoli riferiti a diverse situazioni di lavoro e per differenti macchinari.

- Illuminazione sussidiaria: le istruzioni sull'uso di tali mezzi devono essere rese manifeste al personale mediante "appositi avvisi".
- Mezzi di estinzione: l'acqua non deve essere usata per lo spegnimento in prossimità di sostanze nocive o apparecchi elettrici; i divieti devono essere resi noti al personale mediante appositi avvisi.
- Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto: di tale divieto devono essere resi edotti i lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili".
- Del divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto devono essere resi edotti

i lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili".

- L'accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti e il divieto deve essere richiamato mediante "apposito avviso".

- Gli organi di comando dell'arresto dei motori devono essere chiaramente individuabili mediante "avvisi indicatori".

- Un "cartello indicatore" richiamante l'obbligo di segnale acustico di avvertimento dell'avviamento di motori deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto.

- I vari divieti nell'uso di filatoi automatici intermittenti (es. introduzione fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori) devono essere resi noti mediante "avviso" esposto presso la macchina.

- Le modalità d'impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante "avvisi chiaramente leggibili".

- Le misure di sicurezza indicate per accensione dei focolari e forni devono essere richiamate mediante "avviso" collocato in prossimità dei posti di accensione.

- I recipienti per il trasporto di liquidi o materiali infiammabili o corrosivi devono essere conservati in posti appositi e separati con "l'indicazione" di pieno o di vuoto.

- Sulla porta di ingresso di locali contenenti accumulatori deve essere affisso un "avviso" richiamante il divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera.

- Sulla porta di ingresso di officine e cabine elettriche deve essere esposto un "avviso" indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate.

- E' vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche senza avere prima esposto un "avviso" su tutti i posti di manovra o di comando con l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre".

- Ai lavoratori addetti all'esecuzione di scavi e fondazioni, spalamento e sbancamento, deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante "opportune segnalazioni".

#### Traffico interno

Per quanto concerne la circolazione di mezzi ed il traffico interno allo stabilimento o cantiere si deve far riferimento alla segnalazione vigente riportata dal Codice della strada:

Le vie di circolazione all'interno dei locali è opportuno che siano segnalate con strisce bianche o gialle.

Nei cantieri, alle vie d'accesso e ai punti pericolosi non proteggibili, devono essere apposte "*segnalazioni opportune*".

Nelle vie di transito, quando non sia possibile disporre delle barriere, devono essere poste "*adeguate segnalazioni*".

I "*segnali*" indicanti condizioni di pericolo delle zone di transito devono essere "*convenientemente illuminati*" durante il servizio notturno.

Durante i lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito, "*apposito cartello*" deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

## 10. GESTIONE SOVRAPPOSIZIONE FASI

Il presente capitolo si riferisce ai rischi e pericoli aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di più fasi lavorative all'interno della stessa area di cantiere.

Tale concomitanza di eventi è, per quanto possibile, sconsigliabile poiché comporta spesso situazioni di difficile controllo e non prevedibili per la sicurezza dei lavoratori impegnati in quelle fasi lavorative.

Pertanto in collaborazione con i progettisti delle varie discipline coinvolte, si è studiato un programma temporale dei lavori particolareggiato (v. diagramma di Gantt in allegato) al fine di ridurre al minimo le effettive sovrapposizioni di fasi.

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

In realtà le sovrapposizioni di fasi lavorative si distinguono in:

sovrapposizioni semplicemente temporali (aree lavorative dislocate in sottocantieri diversi);  
sovrapposizioni di fatto (temporali e logistiche) che comportano la presenza contemporanea (stessa area di cantiere, nello stesso tempo) di più lavoratori che eseguono fasi realizzative diverse

Nel caso di sovrapposizioni descritte nel secondo punto, verranno riportate nella tabella posta in seguito, prescrizioni aggiuntive per un migliore coordinamento delle squadre di lavoratori impegnate.

## 11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione dei fattori di rischio e dei successivi indici riguardante i rischi derivanti dall'attività lavorativa analizzata, sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e da informazioni statistiche raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa valutazione.

Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche all'esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

Per una lista orientativa dei fattori di rischio che possono essere presi in considerazione può farsi riferimento all'allegato I degli Orientamenti Cee, fermo restando che tale elenco di situazioni e di attività lavorative possibili, come chiaramente indicato dai suoi compilatori, ha carattere non esaustivo.

I fattori di rischio della fase lavorativa sono desunti dalle schede di sicurezza inserite per quella fase e l'analisi del rischio può essere effettuata per ognuna delle schede inserite.

Vanno considerate le dimensioni possibili del danno derivante da un determinato rischio, in termini di una gamma di conseguenze quali:

- lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili); - lesioni o disturbi di modesta entità; - lesioni o patologie gravi; - incidente mortale; stimando nel contempo la probabilità di accadimento del danno, il livello di probabilità può essere espresso con giudizi in scala crescente.

La valutazione del rischio effettivo avverrà quindi associando per ogni argomento di rischio una probabilità di accadimento di incidente provocata da tale sorgente ed una entità di danno derivante atteso. La probabilità di accadimento è fissata in tre livelli (Improbabile, poco probabile, probabile), mentre la magnitudo del danno atteso è fissata, in ugual modo, in tre livelli di gravità (lieve, media ed alta).

L'entità del rischio associato quindi ad ogni sorgente è rappresentata dal prodotto del valore della magnitudo del danno potenziale per il valore della probabilità di accadimento P relativo a quel rischio.

Nella figura seguente sono rappresentati su una matrice (*Matrice del rischio*) i valori del rischio per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e magnitudo del danno potenziale.

M	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
P			

E' altresì riportata una "Legenda dei rischi" in cui si identificano i vari livelli di rischio con le azioni corrispondenti da intraprendere.

<b>LEGENDA RISCHI</b>		
9	MOLTO ALTO	Fase lavorativa in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione collettiva ed individuale atti a ridurre, per quanto possibile, sia la probabilità che il danno potenziale
6	ALTO	Fase lavorativa in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione collettiva ed individuale atti a ridurre prevalentemente <u>o</u> la probabilità <u>o</u> il danno potenziale
2-4	LIEVE	Fase lavorativa in cui verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo
1	TRASCURABILE	Fase lavorativa in cui i pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo

Al fine di utilizzare dati relativi ad un campione sufficientemente ampio, non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti e/o patologie ovvero una loro modesta gravità, ma riferirsi a campioni statistici quali quelli diffusi dall'Inail.

Va ricordato che nell'igiene del lavoro questa metodologia valutativa presenta molte difficoltà applicative, in quanto non sempre è agevole attribuire valori significativi ai due parametri di riferimento "probabilità" e "gravità", pertanto in tali casi è consigliabile adottare le misure più cautelative.

Si riporta di seguito la tabella riferita alle fasi operative desunte dal WBS con i corrispondenti valori di magnitudo, frequenza e rischio associati.

N°	Descrizione Fasi Operative	Indice Magnitudo	Indice Frequenza	Livello del rischio
2	Piano Terra	Medio	Media	<i>Lieve</i>
93	IMPIANTO ANTINCENDIO	Lieve	Alta	<i>Lieve</i>
25 3	SCALA ANTINCENDIO	Medio	Alta	<i>Alto</i>

## 12. ANALISI GENERICA DELLE FASI OPERATIVE

In questo capitolo si andrà ad analizzare genericamente lo svolgimento delle più particolari fasi operative e le principali caratteristiche dei vari macchinari ed attrezzature utilizzati nei processi lavorativi rimandando alle schede di sicurezza allegate al presente piano per una analisi dei rischi puntuale.

### 12.1 Impianto del cantiere

Al fine di non interferire con situazioni estranee al cantiere, esso sarà convenientemente recintato e saranno definite delle aree di circolazione per le macchine, per il personale e per lo stoccaggio dei materiali; sarà posta inoltre particolare cura affinché persone non attinenti al cantiere, transitanti nelle aree ad esso limitrofe, non si trovino in condizioni di pericolo.

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania



Sarà inoltre posta nelle zone di migliore visibilità apposita cartellonistica di sicurezza per tutte le tipologie di rischio presenti nel cantiere.

#### *Viabilità e zone di carico e scarico materiali*

La zona di carico e scarico degli automezzi, con accesso riservato, deve essere delimitata anche all'interno con staccionata onde garantire la sicurezza della circolazione pedonale dei lavoratori anche durante le operazioni di carico e scarico;

In corrispondenza dell'accesso veicolare dovrà essere affissa la prevista segnaletica di divieto per le persone.

#### *Deposito materiali con pericolo di incendio ed esplosione*

Nel caso di deposito di materiali a maggiore rischio di incendio e/o di esplosione bisognerà prevedere, all'interno del cantiere, una zona, appositamente attrezzata dove dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- predisporre il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e controllando che le uscite siano sempre completamente libere;
- installare un sistema di allarme sonoro;
- assicurarsi che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permettendo l'evacuazione;
- scegliere attrezzature che non possono provocare incendi;
- limitare, per quanto possibile, la quantità di materiali e di prodotti infiammabili.
- isolare i locali a rischio dagli altri locali;
- controllare l'atmosfera per restare sempre al di sotto del 25% dei limiti più bassi di esplosione (LIE);
- evitare ogni fonte di ignizione (scelta di materiale adatto, misure contro la formazione di elettricità statica, ...).
- facilitare l'intervento dei vigili del fuoco (accessi, prese d'acqua, ...);
- fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (dispositivi di rilevamento, mezzi di estinzione, ...);
- organizzare la prevenzione incendio sul posto;
- informare sistematicamente i lavoratori e i nuovi assunti sui dispositivi di estinzione e di primo soccorso (localizzazione, condizioni d'uso) e svolgere delle esercitazioni periodiche;
- in caso di rischio di esplosione, inoltre, prevedere mezzi per scaricare la pressione provocata dall'esplosione.

Prevedere degli estintori in numero sufficiente, di facile accesso e manovrabilità.

#### *Stoccaggio rifiuti*

La gestione dei rifiuti all'interno di un cantiere temporaneo o rappresenta una serie di operazioni, fra loro coordinate ed orientate al rispetto ambientale e della normativa tecnica e legislativa vigente. Nella fattispecie i rifiuti prodotti dovranno essere trasportati dal luogo di produzione all'area predisposta per lo stoccaggio temporaneo ove sarà prevista una raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuti prodotti, prescindendo dai loro quantitativi ed evitando ogni forma di miscelazione.

In tali aree saranno approntati contenitori per la raccolta di tali rifiuti aventi una capienza non superiore a 200 litri, una banda colorata e indelebile identificativa del rifiuto, il simbolo di rifiuto (R nera in campo giallo) con la denominazione della tipologia di rifiuto.

In tali aree dovranno essere allocate opportune (mezzi estinguenti, doccia lavaocchi, assorbitori, presidio di emergenza, ecc.), sistemi di misure di protezione a carattere collettivo (sistema di aspirazione dei vapori, pompa a vuoto per il travaso dei rifiuti liquidi, ecc.) ed individuale (mascherine, guanti, occhiali, camici, ecc.) per gli operatori, una idonea segnaletica, posta all'esterno e all'interno, da cui si evincano le indicazioni comportamentali riguardanti le operazioni di travaso, i primi interventi che si debbono prestare in caso di contaminazione accidentale (della pelle, degli occhi, in caso di ingestione, gli interventi necessari per bonificare il suolo da eventuali rifiuti fuoriusciti, le modalità di spegnimento degli incendi, ecc.

Si dovrà inoltre prevedere un presidio di emergenza (coperta antifiama, maschera antigas, ecc..) nelle estreme vicinanze del deposito, nel caso in cui contenga sostanze infiammabili in grande quantità.

#### *Ubicazione dei depositi*

Il deposito degli inerti per il betonaggio e per il deposito dei vari materiali da costruzione e di materiali di recupero sarà realizzato in una zona agevolmente raggiungibile dall'area di lavorazione.

Un apposita baracca sarà destinata a magazzino all'interno del quale potrà essere reperito lo spazio necessario per ricavare un locale da destinare al deposito di attrezzature.

#### *Servizi igienico-assistenziali e di pronto soccorso*

Sarà garantita la presenza di locali di ricovero, riposo ed eventuale consumo dei pasti, con le attrezzature e gli arredi necessari, di spogliatoi, di gabinetti e di lavabi in numero sufficiente (almeno uno ogni 5 lavoratori o frazione di cinque).

#### *Impianti di alimentazione*

La distribuzione dell'energia elettrica necessaria alle apparecchiature avverrà attraverso linee elettriche protette singolarmente: da quadri principali si dirameranno, a servizio dei settori d'impiego, i quadri elettrici secondari. I cavi elettrici saranno sempre protetti dalle sollecitazioni termiche e dal tranciamento. Sui quadri elettrici secondari saranno montate le prese a spina con i relativi dispositivi di protezione. È opportuno etichettare le spine per individuare immediatamente gli organi di comando ed i circuiti ai quali i dispositivi montati sul quadro elettrico si riferiscono. Le prese a spina per correnti nominali superiori a 16 A saranno tipo interbloccato provviste di fusibili o di dispositivo di comando e di protezione alle sovracorrenti. I componenti dei quadri secondari saranno singolarmente protetti a monte da interruttori differenziali coordinati con l'impianto di terra; tale impianto assicurerà l'equipotenzialità dell'area interessata.

#### *Condizioni di sicurezza impianto di alimentazione*

Controllare che siano sempre a posto coperchi e ripari, interruttori, valvole, morsetti di attacco, ecc. Non toccare parti scoperte.

Proteggere i conduttori elettrici da acqua, cemento, calce; non calpestarli, non farli strisciare. Intervenire quando il rivestimento è logoro o interrotto.

Per poter toccare interruttori, valvole, motori, portalampade, cavi elettrici: le mani, i piedi, il corpo devono essere asciutti; inoltre non toccare contemporaneamente altre parti metalliche vicine.

Nello spostamento di ogni macchina alimentata elettricamente: aprire l'interruttore a monte del cavo volante, oltre a quello sulla macchina.

Quando scatta o fonde una valvola: ricaricarla o mettere un fusibile uguale a quello precedente; se scatta o fonde ancora avvertire l'elettricista per la ricerca della causa che provoca il guasto.

Quando occorrono lampade portatili: usare le apposite. Non improvvisarne con mezzi di fortuna inadeguati.

Lavorando nel bagnato: usare utensili ed apparecchi portatili a tensione ridotta, per mezzo di trasformatori.

La manutenzione ed il controllo periodico dell'impianto devono essere affidati ad un elettricista di professione, anche esperto delle condizioni particolari di funzionamento degli impianti di cantiere.

Il controllo periodico non deve limitarsi al solo controllo visivo delle parti, ma deve prendere la misurazione dell'isolamento degli apparecchi e delle linee elettriche, della resistenza delle linee dei dispersori di terra, tutte da effettuarsi con gli appositi apparecchi dal personale della Appaltatrice.

Gli apparecchi elettrici dovranno essere perfettamente integri e funzionanti: non potranno essere utilizzati utensili con interruttori rotti, e spine non conformi a quelle previste dalla normativa CEI 23-12.

#### *Allacciamento dei sottoservizi all'area di incantieramento*

Una volta definita l'area di incantieramento sarà necessario provvedere alla fornitura dei sottoservizi (idrico, elettrico, fognario e telefonico) alla stessa, in maniera da renderla atta allo scopo cui sarà destinata.

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

A tal proposito si dovrà individuare il punto più vicino all'area di incantieramento del passaggio dei suddetti sottoservizi generalmente interrati e dei punti di attacco all'area stessa e provvedere ad uno scavo a sezione obbligata di profondità non inferiore ad un metro per il collegamento delle tubazioni e dei cavidotti atti allo scopo.

Tali linee dovranno scorrere parallelamente tra di loro senza mai interferire o sovrapporsi in modo da non creare punti di promiscuità, e, nel caso della linea di alimentazione elettrica, si giudicherà all'atto dell'incantieramento se sarà più conveniente realizzare un passaggio interrato od aereo dal punto di consegna ENEL.

In particolare si darà luogo alle seguenti operazioni:

- Decespugliazione ed eventuale taglio piante o, in alternativa, demolizione pavimentazioni stradali;
- Picchettazione per la delimitazione dello scavo;
- Scavo in trincea per posa cavi e/o tubazioni;
- Stendimento strato di sabbia per l'appoggio dei cavi e/o tubazioni;
- Trasporto bobine conduttori e/o tubazioni sul posto;
- Posizionamento cavi interrati e/o tubazioni comprese giunzioni ed accessori;
- Posa copponi in cls di protezione;
- Attacco delle linee e/o tubazioni agli utilizzatori;
- Allacciamento alla linea in tensione e/o condotte di adduzione/scarico;
- Richiusura delle trincee;
- Stendimento binder e tappetino d'usura (ove necessario).

#### *Documentazione da tenere in cantiere*

A scopi preventivi e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la documentazione di cui segue una lista non esaustiva:

#### **DOCUMENTAZIONE GENERALE**

- Copia della notifica preliminare ricevuta da committente/Resp. Lav.
- Notifica inizio lavori in galleria o per interventi in cantiere per presenza di fibre amianto
- Cartello di cantiere

#### **SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE (D. Lgs. N° 81/2008)**

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) (da redigere per TUTTI i cantieri, anche da imprese familiari o con meno di dieci dipendenti)
- Piano di sicurezza specifico (programmazione delle demolizioni, nel caso di lavori comprendenti estese demolizioni)
- Piano di sicurezza specifico (nel caso di montaggio di elementi prefabbricati)
- Piano di lavoro specifico ( nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto, previa autorizzazione ASL)

#### **PRODOTTI E SOSTANZE**

- Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose (Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere)

#### **MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO**

- Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE
- Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro (Documentazione stabilita dall'impresa e redatta per ogni attrezzatura).

#### **DPI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

- Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante

#### **PONTEGGI (Allegato XIX)**

- Autorizzazione Ministeriale e relazione tecnica del fabbricante (per ogni modello presente in cantiere)
- Schema del ponteggio (h <20 m) come realizzato (Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere)

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

- progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi tipo o per altezze superiori a 20 m;

- progetto del castello di servizio (relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico abilitato)

#### IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE E DI MESSA A TERRA

- Schema dell'impianto di terra

- Calcolo di fulminazione

- In caso di struttura non autoprotetta, progetto impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

- Dichiarazione di conformità impianto elettrico e di messa a terra ai sensi D.P.R. 462/2001 completo di schema dell'impianto elettrico realizzato, della relazione dei materiali impiegati e del certificato di abilitazione dell'installatore rilasciato dalla Camera di Commercio ed inviata agli enti competenti

- Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di schema di cablaggio

#### APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

- libretti di omologazione ISPESL degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg. (acquistati prima del settembre 1996);

- Certificazione CE di conformità del costruttore (acquistati dopo settembre 1996)

- Libretto di uso e manutenzione

- copia di denuncia di prima installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;

- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento con firma del tecnico che ha eseguito la verifica;

- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg e conseguente verbale;

- registro verifiche periodiche

- Procedure per gru interferenti

- Certificazione radiocomando gru

#### RISCHIO RUMORE

- Richiesta di deroga per l'eventuale superamento dei limiti del rumore ambientale causate da lavorazioni edili (D.P.C.M. 01/03/1991 e D.P.C.M. 14/11/1997)

- Valutazione esposizione professionale al rumore

#### RECIPIENTI A PRESSIONE

- Libretto recipienti a pressione di capacità superiore a 25 l

#### VARIE

- segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse;

#### DOCUMENTAZIONE GENERALE

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008

c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario

f) nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 81/2008

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo 81/2008

i) documento unico di regolarità contributiva

l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/2008

I lavoratori autonomi dovranno invece esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie


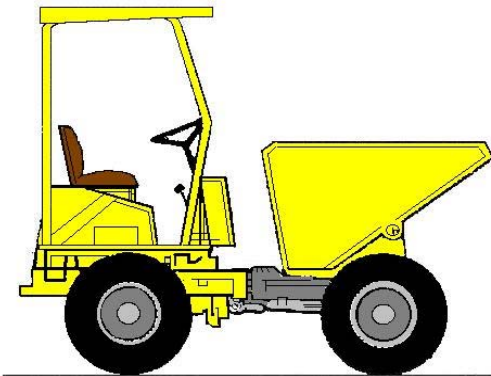
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

*Mezzi ed attrezzature presenti in cantiere*

Vista la tipologia di fasi lavorative necessarie alla realizzazione dell'opera oggetto del presente piano di sicurezza si ipotizza la presenza in cantiere delle seguenti macchine ed attrezzature:

Mezzi meccanici ed Attrezzature	
<p><b>AUTOCARRI - DUMPER</b> Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiere o su strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.</p> <p><b>Note:</b></p>	
<p><b>MINIDUMPER</b> Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiere o su strada di piccole quantità di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.</p> <p><b>Note:</b></p>	

**AUTOCARRO-FURGONE**

Vengono utilizzati per il trasporto di materiali di qualsiasi genere in genere imballato (furgoni) o sciolto (autocarri)

**Note:****AUTOCARRO CON GRU**

Autogrù gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore telescopico, per movimentazione carichi.

**Note:****AUTOGRU****Note:**

**SCALA AEREA** (tipo sfilo manuale)


**Note:****UTENSILI ELETTRICI PORTATILI****Note:****ESCAVATORE**

(oleodinamico)

Macchina usata per lo scavo ed il movimento di terra od altro materiale incoerente. Originariamente erano concepiti per piccoli lavori nell'ingegneria civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologia dei componenti oleodi

**Note:**

<b>BETONIERA A BICCHIERE</b> Attrezzatura utilizzata per la preparazione della malta o del calcestruzzo.  <b>Note:</b>
<b>AUTOBETONIERA (fino a mc. 10 di portata)</b>  <b>Note:</b>
<b>PULISCITAVOLE</b>  <b>Note:</b>
<b>PIEGAFERRI</b> Attrezzatura utilizzata per piegare tondini di ferro per opere in c.a.  <b>Note:</b>
<b>CARRELLO ELEVATORE</b> La sicurezza del carrello elevatore dipende dalla formazione e dalla capacità dell'operatore  <b>Note:</b>
<b>SALDATRICE ELETTRICA</b> La saldatura è un procedimento usato per realizzare a caldo giunzioni stabili tra pezzi metallici, con o senza apporto di materiale fuso.  <b>Note:</b>
<b>MARTELLO DEMOLITORE</b> Martello demolitore ad aria compressa o elettrico a mano.  <b>Note:</b>



<b>TRABATTELLO</b> Trabattello leggero con altezza fino a 4 m  <b>Note:</b>	
<b>SCALA PORTATILE</b>  <b>Note:</b>	

#### *Opere provvisionali.*

Le opere provvisionali sono quelle opere che forniscono ausilio alla realizzazione di lavori civili edili, che hanno una durata limitata da un punto di vista temporale e che pertanto devono essere rimosse non appena è cessata la necessità per la quale sono state erette.

Le opere provvisionali si distinguono in:

- opere di servizio, che servono per lo stazionamento ed il transito sicuro durante il lavoro di persone, cose, attrezzi, materiali, apparecchi di sollevamento;
- opere di sicurezza che servono per impedire la caduta dall'alto di persone e di materiali che possono cadere dalle opere di servizio;
- opere di sostegno che servono per trattenere in posizione sicura ed inamovibile le parti di opera in costruzione fino a quando non sono pronte ad autosostenersi (casceforme, centine, puntelli, ecc.) o strutture di contenimento per scavi di fondazioni o scavi per condutture, collettori, pozzetti spingitubo, attraversamenti stradali, fluviali o ferroviari e banchine provvisionali, su qualsiasi tipo di terreno.

Si prescrive che, in base alle fasi lavorative necessarie alla realizzazione dell'opera, vengano realizzate le seguenti opere provvisionali:

Opere provvisionali	
<b>PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI</b> Montaggio/smontaggio di ponteggio metallico a tubi tondi e giunti. <b>Note:</b>	
<b>INTAVOLATI</b> Realizzazione di intavolati poggiati su cavalletti da ponte o su cavalletti normali da interni. <b>Note:</b>	
<b>REALIZZAZIONE PARAPETTI</b> Realizzazione di protezioni (parapetti) per porre in sicurezza	



un piano di lavoro o di transito (anche su ponteggi) quando si è in presenza di un salto di quota che metta a rischio la sicurezza degli operatori o di estranei. <b>Note:</b>	
MANTOVANE PARASASSI Il lavoro consiste nella realizzazione di parasassi su tutti i piani di lavoro realizzati nel ponteggio, o in quei casi che il piano di lavoro sia sopraelevato rispetto ad altre zone di transito e lavoro <b>Note:</b>	

## 12.2 Scavi e splateamenti

Si definisce scavo l'operazione di asportazione di rocce e terra dalla collocazione originaria al fine di creare splateamenti, spazi e/o cavità di forme e dimensioni opportune per la realizzazione delle opere da realizzare.

In questa paragrafo vengono trattate le misure e le normative di sicurezza relative agli splateamenti e sbancamenti ed alla creazione di trincee e scavi a sezione obbligatoria.

### *Misure di prevenzione*

Prima dell'inizio dei lavori il committente, in caso di appalto degli stessi ad una impresa o a lavoratori autonomi, deve verificare l'idoneità tecnico-professionale e deve fornire precise informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area di lavoro ed in particolare, sull'esistenza di condutture elettriche sotterranee o aeree, tubazioni, o altre condizioni che possano determinare pericoli per i lavoratori.

Nel caso in cui il datore di lavoro affidi l'esecuzione dell'operazione a proprio personale dipendente, deve provvedere ad informarlo dettagliatamente dei rischi specifici dell'attività che dovrà svolgere.

Qualora lo scavo rivesta notevole importanza e complessità, si rende necessaria la redazione di un apposito programma, che può essere preceduto, se necessario, da indagini geognostiche. Il programma deve prevedere sia le caratteristiche di sviluppo dello scavo, sia le difese che debbono essere approntate durante l'esecuzione dei lavori, onde garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati.

### *a) Splateamenti e sbancamenti*

L'articolo 181 del D. Lgs. N° 81/2008 fornisce le seguenti precisazioni:

- Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
- Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
- Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

- Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
- Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
- Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
- Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

### **12.3 Autogru**

Vengono definite "autogru" le gru mobili installate su carro proprio.

Tali mezzi rivestono particolare importanza soprattutto per il carico e scarico delle attrezzature e dei materiali.

Ai fini del calcolo delle strutture in acciaio di apparecchi di sollevamento, come per i meccanismi, questi vengono raggruppati in classi in relazione ai compiti che devono assolvere durante la loro vita. Della classe dell'apparecchio si dovrà tener conto sia in fase di approvvigionamento, sia in fase di utilizzazione.

#### *Uso e manutenzione*

I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere utilizzati in modo rispondente alle loro caratteristiche secondo la classe indicata dal costruttore.

Gli apparecchi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza e quindi sottoposti a periodica manutenzione secondo le indicazioni del manuale tecnico della casa costruttrice.

#### *Stabilità del mezzo e del carico*

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento devono essere adottate le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico in relazione al tipo del mezzo stesso.

Le autogru possono lavorare nel rispetto della tabella di portata sia su gomme che su stabilizzatori. Per quanto concerne gli apparecchi poggianti su gomme la stabilità del mezzo è garantita dal buono stato del pneumatico e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio, adeguato ai carichi trasmessi ed alla velocità di servizio prevista: in caso di sostituzione il pneumatico dovrà essere del tipo indicato dalla casa costruttrice della gru e riportato sul libretto di immatricolazione.

Talune autogru montano gomme riempite con liquido speciale; tali gomme devono risultare di tipo appropriato alla movimentazione dei carichi; devono altresì essere osservati i limiti di velocità imposti per il tipo di gomma.

Se l'apparecchio poggia su martinetti stabilizzatori questi dovranno essere corredati immediatamente all'uscita del cilindro di valvola di blocco per impedire il rientro accidentale dello stabilizzatore in caso di rottura della tubazione. Il piatto dello stabilizzatore verrà ampliato in relazione alla pressione specifica trasmessa ed alla natura del terreno.

All'atto della stabilizzazione del carro è necessario avere riguardo alla resistenza del terreno di appoggio onde garantire l'orizzontalità del carro durante l'esercizio.

Le autogrù possono essere predisposte per portate su pneumatici con interessamento dei dispositivi di sospensione per la corretta ripartizione dei carichi. Qualora non esistano dispositivi meccanici o idraulici applicati direttamente agli assali e/o ai cilindri per l'esclusione delle sospensioni, queste devono essere provviste di dispositivi di blocco atti ad interrompere il collegamento con accumulatori o pompa per evitare ogni travaso. Le tubazioni del sistema devono essere calcolate secondo norme di buona tecnica.

Qualora, in conformità alle norme di calcolo, sia stata adottata per la verifica di esercizio una pressione cinetica del vento inferiore alla massima, dovrà essere previsto sull'apparecchio o nell'ambito del cantiere un dispositivo di segnalazione anemometrico.


#### *Limitatore di carico e di momento*

Secondo la normativa vigente questo dispositivo non è obbligatorio per le autogru; tuttavia se installato deve risultare efficiente.

Il dispositivo limitatore di carico e di momento deve essere commisurato alle prestazioni nominali dell'apparecchio con una tolleranza massima del 10%.

#### *Funi e catene sfilo braccio*

Il coefficiente di sicurezza per le funi utilizzate per lo sfilo degli elementi del braccio di autogrù dovrà essere non inferiore a 6 in relazione agli sforzi indotti. Il coefficiente potrà essere non inferiore a 5 qualora la fune stessa funga da tirante deviato da pulegge e cioè non sia previsto per la gru sfilo del braccio con carico applicato. Per le catene il coefficiente dovrà comunque essere non inferiore a 5.

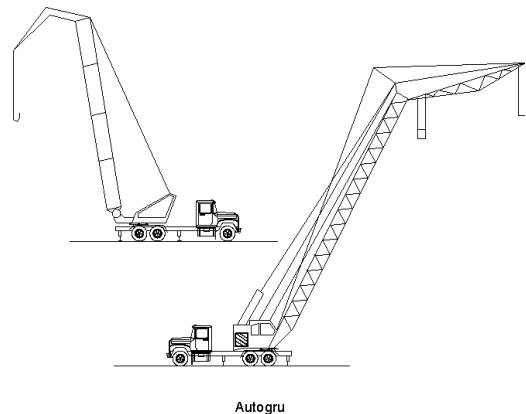

## **12.4 Imbracaggio dei carichi per la movimentazione**

Vengono definiti "sistemi di imbracaggio" i sistemi e modalità atti a permettere il sollevamento ed il trasporto del carico.

#### *Misure di sicurezza*

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.

La mancata specificazione dei "mezzi idonei" comporta la necessità di stabilire di volta in volta se i mezzi adottati possano ritenersi idonei, secondo un criterio tecnico oggettivo, ad impedire l'insorgere di una situazione di pericolo.

Dirigenti e preposti devono dare specifiche istruzioni al personale addetto all'imbracaggio in particolare per quanto riguarda la natura dei carichi, il peso, la posizione presumibile del baricentro sollevato.

#### *Contenitori*

Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse nè piattaforme semplici nè imbracature.

#### *Tiranti*

Sono composti da un tratto unico di corda, fune o catena con esclusione di qualsiasi giunzione e terminano normalmente ai due estremi con anelli o ganci di sicurezza passanti entro redance. I sistemi di imbracaggio a fune o catena devono essere commercializzati in conformità al D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673.

L'efficienza dei tiranti si riduce quanto più si amplia il loro angolo al vertice. Quando il carico è di notevoli dimensioni (e cioè se occorressero brache con angoli al vertice eccessivi) è necessario utilizzare bilanceri.

In riferimento all'apertura dell'angolo al vertice del sistema di imbracaggio, la sollecitazione effettiva degli elementi del sistema viene incrementata in funzione di un fattore di aumento di carico (c) riportato nella figura che segue.

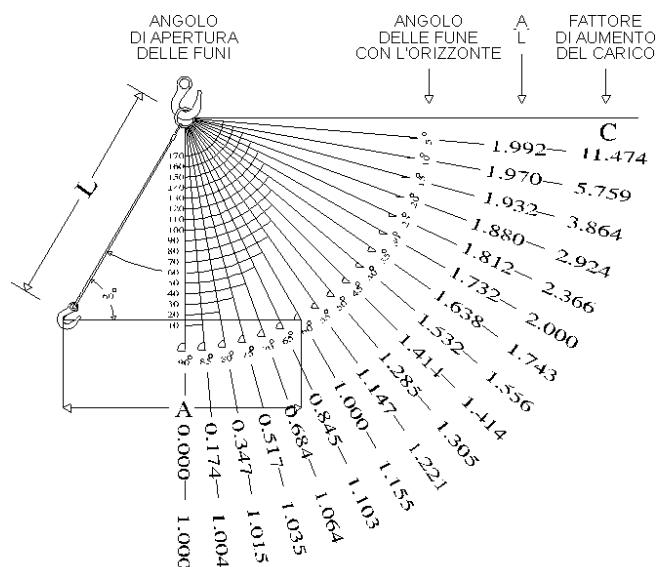


Fig. 1

### Bilancieri

I bilancieri devono essere calcolati in relazione alla portata ed al servizio che devono svolgere.

Sui bilancieri, come su ogni organo di presa, deve essere indicata la portata massima ammissibile ed il peso proprio del bilanciere che dovrà essere detratto dalla portata della gru.

### Corde

Il coefficiente di sicurezza per le funi composte di fibre deve essere pari a 10.

Per le corde di fibra naturale (canapa, ecc.), date le caratteristiche meno costanti del materiale, risulta opportuna l'utilizzazione a portata ridotta.

Si rammenta che in presenza di umidità si può avere una riduzione di portata del 30%; tali materiali necessitano di catramatura o di trattamento con prodotti antimuffa.

### Coefficienti di sicurezza

I coefficienti di sicurezza da adottare sono gli stessi delle funi (6) o catene (5) di sospensione; per le funi composte di fibre il coefficiente di sicurezza deve essere 10.

Secondo la giurisprudenza l'obbligo del datore di lavoro di eseguire a mezzo di personale specializzato o da lui scelto la verifica trimestrale delle funi o catene degli apparecchi di sollevamento concerne anche le prolunghie che, costituendo un'estensione delle funi o catene medesime, debbono essere formate di materiale della stessa consistenza e resistenza.

### Nastri

Sono elementi a fibre parallele in resine poliestere che sono fornite con coefficiente di sicurezza pari a 6 (relazione CSC ENPI n. 354 del 3.7.1979); risultano inattaccabili all'umidità, all'acqua marina, ai grassi, alla luce solare. Hanno limiti di impiego in relazione all'ambiente chimico, ed alla temperatura d'impiego (max 100°C). Anche per questo materiale vanno considerate le riduzioni di portata in relazione alla inclinazione dei tratti o di imbracaggio a cappio.

Il nastro, sottoposto anch'esso a controllo periodico, dovrà essere escluso dal servizio quando la guaina esterna risulti lacerata e le fibre interne visibili e quando cominci a perdere flessibilità.

### Uso di più gru per sollevamento di un unico carico

Questo tipo di operazioni rientra tra quelle per le quali l'utente deve specificamente provvedere a dare le opportune disposizioni di servizio ed a corredare gli apparecchi di eventuali dispositivi supplementari idonei a garantire la stabilità dei mezzi e del carico.

In particolare si ritiene che in via minimale debba controllarsi, tra l'altro, che gli apparecchi di sollevamento abbiano caratteristiche omologhe in relazione alle prestazioni richieste (portata, velocità, accelerazioni, ecc.); che le operazioni si svolgano sotto la vigilanza di un preposto competente e che tutte le operazioni siano preventivamente pianificate; che le gru possano comandarsi da un posto di manovra univoco e sicuro o che esistano sistemi che consentano di

impartire tempestivamente gli ordini di manovra ai conduttori in cabina; che durante le operazioni gli apparecchi non vengano in nessun modo sovraccaricati o meglio che siano corredati di dispositivi limitatori di carico, e se del caso di momento, per garantire l'impossibilità di sovraccarico strutturale delle gru; che le operazioni di imbracaggio siano progettate e condotte in modo da evitare la caduta del carico o del suo spostamento dalla primitiva posizione di ancoraggio.

#### *Avvertenze*

Gli obblighi di istruire il personale addetto trovano riscontro nel disposto dell'art. 73 del D. Lgs. 81/2008

L'imbracatura dei carichi deve essere eseguita esclusivamente dal personale appositamente addetto. Gli ordini di esecuzione delle manovre possono essere impartiti esclusivamente dagli incaricati di tale compito.

Quando all'imbracatura dei carichi sono adibiti più operai, il controllo delle operazioni ed i comandi di movimento devono essere affidati ad una sola persona specificatamente preparata e responsabilizzata.

Gli ordini di manovra devono essere dati secondo apposito codice.

L'imbracatore deve:

- usare solo le funi, le catene e le attrezzature speciali messe a sua disposizione ed eliminare i pezzi deteriorati;
- accertarsi del peso del carico da sollevare, rivolgendosi eventualmente al proprio capo;
- scegliere le funi e le catene in base al peso da sollevare tenendo conto dell'inclinazione dei tratti portanti. Oltre i 120° è opportuno far uso dei bilancieri;
- sistemare tra le funi o catene ed il pezzo da sollevare idonee sagome di protezione contro gli spigoli vivi;
- verificare l'equilibrio del carico imbracato, mettendo lentamente in tensione le funi;
- portare il carico ad altezza giusta per superare gli ostacoli che si presentano lungo il percorso;
- ordinare la discesa graduale del carico, facendolo poggiare su superfici piane e resistenti in modo che l'allentamento dell'imbracatura non avvenga troppo rapidamente con rischio di instabilità;
- assicurarsi che, durante le manovre a gru scarica, le funi e le catene sospese non urtino contro ostacoli o rimangano ad altezza d'uomo;
- riporre con ordine le funi e le catene nelle apposite rastrelliere.

La giurisprudenza ha chiarito che le norme concernenti la stabilità e l'imbracatura dei carichi ed il divieto di sospensione degli stessi sopra i lavoratori contengono precetti che si rivolgono non solo agli addetti a terra a tali operazioni, ma anche ai gruisti che hanno il dovere di seguire i movimenti della gru onde evitare pericoli.

#### *Segnalazioni gestuali*

Le segnalazioni gestuali devono essere portate a conoscenza del personale addetto agli apparecchi di sollevamento.

Tali segnalazioni devono essere portate a conoscenza dei gruisti, degli imbragatori e del personale incaricato del servizio di segnalazione ove ricorra il caso di visibilità ridotta dal posto di manovra della gru.

È opportuno che le segnalazioni vengano date da un unico lavoratore incaricato, secondo lo schema di seguito indicato:

Amarraggio (equilibratura e messa in tensione delle funi o catene di imbracaggio): direzione del pollice e movimento dell'avambraccio secondo i casi.

Sollevamento: ascensionale della mano nel senso della spirale.

Traslazione: movimento del braccio secondo il senso di traslazione richiesto.

Messa in posizione: spostamento orizzontale delle mani secondo il bisogno.

Discesa e salita minima: spostamento orizzontale delle mani secondo il bisogno.

Discesa: direzione dell'indice e movimento del braccio verso terra.

Arresto: movimento orizzontale del braccio all'altezza del petto.

Arresto immediato: doppio rapido movimento orizzontale del braccio all'altezza del petto.

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

Per ulteriori informazioni vedasi paragrafo “Segnaletica di sicurezza, targhe, avvisi” del presente PSC.

#### *Mezzi personali di protezione*

Gli imbricatori devono fare uso di idonei mezzi personali di protezione in relazione ai rischi specifici più frequenti nel loro lavoro.

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto devono essere provvisti di elmetto di protezione. È inoltre obbligatorio l'uso di guanti di protezione contro il pericolo di punture, tagli, abrasioni. Anche i piedi devono essere opportunamente protetti con scarpe resistenti con puntale rinforzato contro il pericolo di schiacciamento e suola antisdrucchiolevole.

Tutti i mezzi personali di protezione devono essere dati in dotazione al lavoratore dal datore di lavoro e devono essere mantenuti in buono stato di conservazione.

#### *Adempimenti amministrativi*

A far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, le funi, le catene, gli accessori di sollevamento sono immessi sul mercato anche indipendentemente dalla macchina. L'utilizzatore di gru deve tenere presente nell'acquisizione di tali accessori le disposizioni comunitarie previste che sono espresse anche per attestare la qualità del prodotto al punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.

Le funi metalliche e le catene destinate alle operazioni di sollevamento possono essere immesse sul mercato, se non facenti già parte integrante di una macchina marcata CE, solo se munite di marchio o targa o anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario nell'Unione europea e di una attestazione conforme a una norma armonizzata o, in assenza, con le seguenti indicazioni minime:

- nome del fabbricante o del mandatario
- indirizzo del fabbricante o del mandatario
- descrizione della catena o fune (dimensioni, costruzione, materiale, trattamenti metallurgici speciali)
- norma impiegata in caso di prova
- carico massimo di funzionamento (o valori in funzione delle applicazioni previste).

Quanto sopra modifica le disposizioni della Direttiva Europea n. 73/361 relativa alle attestazioni e contrassegni di funi, catene e ganci già recepita in Italia con D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673.

Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi:

- identificazione del fabbricante
- identificazione del materiale (es. classe internazionale)
- identificazione del carico massimo di utilizzazione
- marchio CE.

La Direttiva prescrive che per gli accessori che comprendono componenti come funi e cordami sui quali la marcatura è impossibile, le indicazioni devono essere riportate su targa o altri mezzi fissati solidamente all'accessorio.

Per la verifica e la manutenzione delle funi fare riferimento alle norme vigenti.

## **12.5 Valutazione esposizione professionale alle vibrazioni**

Il Titolo VIII, Capo III del D. Lgs. N° 81/2008 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, che ha recepito la Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002, prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto al Capo III, Sezione II del D. Lgs. n° 81/2008.

La possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del processo di individuazione e valutazione professionale del rischio al fine di salvaguardare il lavoratore e tale fine è perseguibile

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

variando il ciclo produttivo o dotando, ove possibile, il lavoratore di DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere adeguatamente e ridurre comunque i livelli di esposizione. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi, la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva.

L'ambito di applicazione definito al Capo III è individuato dalle seguenti definizioni date all'art. 200 del D. Lgs. N° 81/2008 :

**Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:** *“le vibrazioni meccaniche che se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari”*

**Vibrazioni trasmesse al corpo intero :** *“le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide ”*

L'articolo 202 del D. Lgs. N° 81/2008 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. E' inoltre previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN. La valutazione, con o senza misure, sarà programmata ed effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente.

La valutazione prenderà in esame i seguenti elementi:

Entità delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, in relazione ai livelli d'azione ed ai valore limite prescritti dal D. Lgs. N° 81/2008 all'articolo 201 e riportati di seguito ;

<i>Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio</i>	
Livello d'azione giornaliero di esposizione $A(8) = 2,5 \text{ m/s}^2$	Valore limite giornaliero di esposizione $A(8) = 5 \text{ m/s}^2$
<i>Vibrazioni trasmesse al corpo intero</i>	
Livello d'azione giornaliero di esposizione $A(8) = 0,5 \text{ m/s}^2$	Valore limite giornaliero di esposizione $A(8) = 1,15 \text{ m/s}^2$

gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente esposti;

gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine;

l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;

condizioni di lavoro particolari che possano incrementare il rischio, quali ad esempio il lavoro a basse temperature nel caso dell'esposizione a vibrazioni mano-braccio.

Per effettuare la valutazione si è reso necessario:

individuare i lavoratori esposti al rischio;

individuazione delle attrezzature di lavoro utilizzate dal lavoratore;

individuazione del tempo di esposizione in relazione alle attrezzature;

determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

La determinazione del suddetto valore di esposizione si basa sulla seguente formulistica rispettivamente riportata per il sistema mano-braccio (HAV) e per il corpo intero (WBV).

*Sistema mano-braccio (HAV)*

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro [A(8)]

(m/s<sup>2</sup>)], calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana alle vibrazioni A(8), in m/s<sup>2</sup>, sarà ottenuta mediante l'espressione:

$$A(8) = \left[ \sum_{i=1}^n A(8)_i^2 \right]^{1/2} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Dove A(8)<sub>i</sub> è pari a  $A(8) = A_{wsum} * (T_e/8)^{1/2}$  con T<sub>e</sub> tempo di esposizione effettivo alla i-esima macchina

#### *Sistema corpo intero (WBV)*

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s<sup>2</sup>), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (A<sub>wmax</sub>).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s<sup>2</sup>, sarà ottenuta mediante l'espressione:

$$A(8) = \left[ \sum_{i=1}^n A(8)_i^2 \right]^{1/2} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Dove A(8)<sub>i</sub> è pari a  $A(8) = A_{wmax} * (T_e/8)^{1/2}$  con T<sub>e</sub> tempo di esposizione effettivo alla i-esima macchina.

Ove non si faccia uso di specifiche misurazioni sul campo, i valori delle accelerazioni ponderate in frequenza possono derivare da:

Acquisizione da banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR)

Acquisizione dei valori dichiarati dal costruttore (in tal caso si raccomanda di utilizzare i dati dichiarati dai produttori opportunamente moltiplicati per i fattori indicati alle Tabelle dei valori di correzione riportati nelle Linee Guida ISPESL solo qualora le condizioni di impiego siano effettivamente rispondenti a quelle indicate nelle tabelle e nel caso in cui i macchinari siano in buone condizioni di manutenzione.)

I valori desunti secondo le metodologie sopra descritte non saranno usati se:

il macchinario non è usato in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore;

il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione;

il macchinario è usato in condizioni operative differenti da quelle indicate alle tabelle 4-5-6 delle Linee Guida ISPESL;

il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca o modello).

**In tutti i casi in cui l'impiego della Banca Dati Vibrazioni può portare ad una sottostima del rischio si ricorrerà a misurazione diretta dell'esposizione a vibrazione nelle effettive condizioni di impiego dei macchinari.**

Il D. Lgs. n° 81/2008 prescrive che, ove siano superati i livelli di azione (mano braccio: A(8) = 2,5 m/s<sup>2</sup> ; corpo intero: 0,5 m/s<sup>2</sup>) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni, considerando in particolare:

altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;



fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;  
adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;  
la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;  
adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche;  
la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;  
orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo;  
la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità .

L'art. 204 del D.Lgs. n° 81/2008 dispone inoltre che:

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria che deve essere effettuata periodicamente, una volta l'anno, o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

I lavoratori esposti a vibrazioni sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria anche quando, secondo il medico competente, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute

è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico.

Nel caso sopra citato, il datore di lavoro:

sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata;

sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio. Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni dovrà essere effettuata dal datore di lavoro seguendo il metodo indicato nelle *“Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro”* elaborate dall'ISPESL e consistente nella:

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio.

Individuazione, per ogni lavoratore, del tempo di esposizione alle vibrazioni.

Individuazione (marca e tipo) delle singole macchine o attrezzature utilizzate.

Individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante l'utilizzo delle stesse.

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

L'individuazione delle suddette informazioni discende dalla conoscenza completa delle mansioni, delle attrezzature, delle fasi lavorative e dei tempi di esposizione espletati dal singolo lavoratore,  
Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

quindi, tale indagine può essere effettuata in maniera completa ed esaustiva solo se in possesso della conoscenza adeguata che, in fase di progettazione, è carente, e pertanto si demanda, alla stesura di tale valutazione, l'impresa esecutrice dei lavori che la riporterà all'interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

### 13. GESTIONE EMERGENZE

Il D. Lgs. n° 81/2008, sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, affronta fra i suoi argomenti il tema dell'emergenza. In particolare all'art. 18 si formulano indicazioni a carico dei datori di lavoro relative alle misure da attuare in caso di prevenzione degli incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, che possono concretizzarsi in una vera e propria gestione dell'emergenza.

Le situazioni critiche, che possono dar luogo a situazioni di emergenza, possono essere grossolanamente suddivise in:

- eventi legati ai rischi propri dell'attività (incendi e esplosioni, rilasci tossici e/o radioattivi, etc.)
- eventi legati a cause esterne (allagamenti, terremoti, condizioni meteorologiche estreme, etc.).

Obiettivi principali e prioritari, di un piano di emergenza aziendale, sono pertanto quello di:

- ridurre i pericoli alle persone;
- prestare soccorso alle persone colpite;
- circoscrivere e contenere l'evento (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) per limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività produttiva al più presto.

Considerato il tipo di attività svolta prevalentemente nel cantiere, così come previsto dal Decreto Ministeriale 10/03/98, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, bisognerà effettuare la valutazione del rischio di incendio in conformità ai criteri di cui all'Allegato I del D.M. 10/03/98 ed, in base al livello di rischio presente, si adotteranno apposite misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio per la gestione delle emergenze.

Sarà necessario effettuare la formazione ed informazione dei lavoratori delle imprese delegati allo scopo, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 10/03/98 con i contenuti minimi riportati nell'allegato IX del citato Decreto.

Lo schema organizzativo consisterà essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza ed in controlli preventivi.

In particolare dovranno essere effettuate le seguenti designazioni nominative:

- chi diffonde l'ordine di evacuazione;
- chi telefona ai numeri preposti per l'emergenza (115, 112, 113 o 118);

Tali designazioni saranno variabili, dipendenti dalla composizione della squadra tipo di lavoratori ed a discrezione del Responsabile del Sistema di Gestione Emergenze (RSGE).

In linea generale, a supporto dell'informazione e formazione obbligatoria che le imprese dovranno attuare, si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e controlli preventivi, salvo diverse disposizioni da segnalare chiaramente nel Piano Operativo di Sicurezza a cura dell'impresa:

Il preposto è l'incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato; una volta dato il segnale di evacuazione, provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri telefonici si trovano nella scheda "*Telefoni ed Indirizzi utili*" inserita nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica siano e rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, all'adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, spegneranno le attrezzature in uso e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (segnalato nelle apposite planimetrie) avendo cura di avviarsi a passo veloce senza correre.

La particolarità delle aree di cantiere rende estremamente importanti le procedure di emergenza in quanto gli spazi sono limitati, presentano ostacoli particolari e la tipologia dei lavori rende difficile il possibile intervento e la facile evacuazione in caso di necessità.

Si ritiene quindi necessario che l'Impresa impartisca delle direttive che, in relazione all'evolversi dei lavori il Responsabile della Sicurezza in Cantiere dovrà sempre e costantemente garantire:

- mantenere sgombre e facilmente apribili le vie d'accesso del cantiere;
- predisporre vie di esodo orizzontali e verticali;
- segnalare, con nota informativa ai lavoratori e con apposita segnaletica, le vie d'esodo in caso di necessità;
- mantenere fruibili ed adatte, su ciascun piano, le vie di accesso ;
- predisporre adeguati estintori controllandone costantemente l'efficienza;
- segnalare la posizione degli estintori con apposita segnaletica;
- attivare la formazione dei lavoratori sull'uso degli estintori e sulle normali procedure di emergenza e soccorso.

Il personale operante sul cantiere dovrà conoscere le procedure e gli incarichi specifici assegnati onde affrontare al meglio eventuali situazioni di emergenza.

## **14. COSTI DELLA SICUREZZA**

Secondo la definizione dei contenuti del piano di sicurezza data al punto 2 dell'Allegato 15 del D. Lgs. 81/2008, il documento deve contenere “...la stima dei costi della sicurezza ai sensi del punto 4.1”

Quest'ultimo elemento di valutazione, richiesto espressamente dal D. Lgs. 81/2008, costituisce senz'altro uno degli aspetti oggi maggiormente dibattuti e cruciali relativamente al contenuto dei PSC ed al confronto tra Committente ed Impresa appaltatrice.

Un'ulteriore accento è stato posto, oltre che dal sopraccitato articolo, anche dall'art. 31 bis della L. 109/94 (Merloni ter e successive modifiche), sulla questione riguardante l'individuazione, la quantificazione e la non assoggettabilità a ribasso d'asta degli oneri della sicurezza nei confronti degli appaltatori.

### **14.1 Determinazione dei costi**

La stima analitica dei costi di prevenzione, così come richiamata nel citato punto 4 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 , assume come base di calcolo, per ciascuna voce di costo,

- gli apprestamenti previsti nel PSC;
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi;
- i mezzi e servizi di protezione collettiva;
- le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento

Nel presente paragrafo si fornisce pertanto l'incidenza di tutti gli apprestamenti inerenti la salvaguardia delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, così come prescritto nel presente piano, sia in relazione al numero e alla tipologia dei D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori addetti

---

alle singole fasi lavorative, che in funzione delle opere provvisorie necessarie per l'esecuzione in sicurezza delle fasi lavorative stesse, nonché dei servizi igienico-assistenziali messi a disposizione dei lavoratori.

Ai sopra esposti costi vanno poi aggiunti gli oneri prettamente organizzativi e procedurali necessari per garantire l'esecuzione dell'intero processo produttivo in sicurezza, oltre ovviamente a tutte quelle predisposizioni provvisorie necessarie per la delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro oppure costituenti protezioni collettive ed individuali.

Riepilogando occorre:

Individuare la quota parte degli **oneri diretti** della sicurezza, già presenti nella stima del computo metrico estimativo (**OD**)

Questi costi, essendo già considerati non si sommano a quelli dell'opera, ma vanno solamente estrapolati ed identificati come non soggetti a ribasso d'asta.

Individuare le eventuali specifiche opere di sicurezza, non prevedibili nell'analisi dei prezzi delle opere compiute, per le quali viene effettuata una apposita stima.

Questi oneri, non essendo stati considerati nel computo metrico, si sommano al costo complessivo, venendo identificati come **oneri specifici (OS)**

**Con l'accettazione del presente piano da parte dell'impresa appaltatrice si intende accettata senza riserva alcuna anche la suddetta stima dei costi onnicomprensivi per l'applicazione di tutte le necessarie misure intese a garantire la sicurezza nel corso dei lavori, nessuna esclusa quant'anche non esplicitamente richiamata nel presente Piano.**

In nessun caso le eventuali integrazioni apportate al seguente Piano dall'Appaltatore per meglio garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza e delle effettive attrezzature e macchinari utilizzati per la realizzazione dei lavori, potranno giustificare modifiche o adeguamento alla suddetta stima.

<b>OD - ONERI DIRETTI, GIÀ CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI</b>
---

Stima dei lavori	237.724,27
------------------	------------

Stima degli oneri diretti (OD)	
--------------------------------	--

<b>IE.034 - Punto luce semplice, deviato, commutato,</b>					
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo
	Punto luce semplice, deviato, commutato, . . .		1	128,94	128,94
					3,00% 128,94
<b>IE.036 - Presa di corrente bipolare bipasso 2x10/</b>					
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo
	Presa di corrente bipolare bipasso 2x10/ . . .		1	49,91	49,91
					3,00% 49,91
<b>14.1.11.1 - Punto presa di corrente bipasso 2x10/16</b>					
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo
	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 . . .		1	25,70	25,70
					3,00% 25,70
<b>14.1.21 - Punto presa d'antenna televisiva di</b>					
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo
	Punto presa d'antenna televisiva di . . .		1	28,76	28,76
					3,00% 28,76
<b>IE.006 - Collegamento equipotenziale di masse est</b>					
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo
	Collegamento equipotenziale di masse est . . .		1	2,47	2,47
					3,00% 2,47
<b>IE.037 - Smontaggio e rimontaggio di apparecchi d</b>					

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Smontaggio e rimontaggio di apparecchi d . . .		1	53,66	53,66	
						3,00% 53,66
<b>IE.015 - Fornitura e posa di apparecchi di illumi</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa di apparecchi di illumi . . .		1	7,21	7,21	
						3,00% 7,21
<b>IE.016 - Fornitura di apparecchi di illuminazione</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura di apparecchi di illuminazione . . .		1	12,51	12,51	
						3,00% 12,51
<b>IE.010 - Fornitura e posa in opera di collettore</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di collettore . . .		1	2,58	2,58	
						3,00% 2,58
<b>IE.008 - Sovraprezzo per gruppo di emergenza per</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Sovraprezzo per gruppo di emergenza per . . .		1	7,95	7,95	
						3,00% 7,95
<b>IE.028 - Quadro per apparecchiature elettriche, f</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Quadro per apparecchiature elettriche, f . . .		1	47,09	47,09	
						3,00% 47,09
<b>IE.017 - Armadio componibile altezza 1400 mm, in</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Armadio componibile altezza 1400 mm, in . . .		1	26,46	26,46	
						3,00% 26,46
<b>IE.018 - Armadio componibile per alloggiamento mo</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Armadio componibile per alloggiamento mo . . .		1	8,30	8,30	
						3,00% 8,30
<b>14.6.1 - Campanello elettrico per porta</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Campanello elettrico per porta . . .		1	6,48	6,48	
						3,00% 6,48
<b>IE.019 - Quadro di rifasamento automatico, della</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Quadro di rifasamento automatico, della . . .		1	42,43	42,43	
						3,00% 42,43
<b>IE.021 - Gruppo di misura, fino a 600 A, per quadr</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Gruppo di misura, fino a 600 A, per quadr . . .		1	6,72	6,72	
						3,00% 6,72
<b>IE.005 - Maggior onere per custodie fino a tre pu</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Maggior onere per custodie fino a tre pu . . .		1	2,44	2,44	
						3,00% 2,44
<b>PR.7B - Fornitura e posa in opera di tubo in PVC</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC . . .		1	137,64	137,64	
						3,00% 137,64
<b>QQ.156 - Termoprogrammatore elettronico settima-</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Termoprogrammatore elettronico settima- . . .		1	5,19	5,19	
						3,00% 5,19
<b>PR.7C - Fornitura e posa in opera di tubo in PVC</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC . . .		1	44,21	44,21	

						3,00%	44,21
<b>18.1.3.1 - Formazione di pozzetto per marciapiedi i</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Formazione di pozzetto per marciapiedi i . . .		1	13,78	13,78		
						3,00%	13,78
<b>6.4.4 - Fornitura e posa in opera di telaio e gr</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e posa in opera di telaio e gr . . .		1	13,54	13,54		
						3,00%	13,54
<b>18.5.2.4 - Fornitura e collocazione di conduttori i</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e collocazione di conduttori i . . .		1	290,34	290,34		
						3,00%	290,34
<b>IE.034 - Punto luce semplice, deviato, commutato,</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Punto luce semplice, deviato, commutato, . . .		1	124,78	124,78		
						3,00%	124,78
<b>IE.036 - Presa di corrente bipolare bipasso 2x10/</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Presa di corrente bipolare bipasso 2x10/ . . .		1	55,11	55,11		
						3,00%	55,11
<b>14.1.11.1 - Punto presa di corrente bipasso 2x10/16</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 . . .		1	23,56	23,56		
						3,00%	23,56
<b>14.1.21 - Punto presa d'antenna televisiva di</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Punto presa d'antenna televisiva di . . .		1	28,76	28,76		
						3,00%	28,76
<b>IE.006 - Collegamento equipotenziale di masse est</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Collegamento equipotenziale di masse est . . .		1	2,47	2,47		
						3,00%	2,47
<b>IE.015 - Fornitura e posa di apparecchi di illumi</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e posa di apparecchi di illumi . . .		1	2,40	2,40		
						3,00%	2,40
<b>IE.008 - Sovraprezzo per gruppo di emergenza per</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Sovraprezzo per gruppo di emergenza per . . .		1	3,98	3,98		
						3,00%	3,98
<b>IE.017 - Armadio componibile altezza 1400 mm, in</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Armadio componibile altezza 1400 mm, in . . .		1	13,23	13,23		
						3,00%	13,23
<b>IE.018 - Armadio componibile per alloggiamento mo</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Armadio componibile per alloggiamento mo . . .		1	4,15	4,15		
						3,00%	4,15
<b>14.6.1 - Campanello elettrico per porta</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Campanello elettrico per porta . . .		1	6,48	6,48		
						3,00%	6,48
<b>IE.005 - Maggior onere per custodie fino a tre pu</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Maggior onere per custodie fino a tre pu . . .		1	2,44	2,44		
						3,00%	2,44
<b>PR.7B - Fornitura e posa in opera di tubo in PVC</b>							

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC . . .		1	142,27	142,27	
						3,00% 142,27
<b>QQ.156 - Termoprogrammatore elettronico settima-</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Termoprogrammatore elettronico settima- . . .		1	2,59	2,59	
						3,00% 2,59
<b>IE.037 - Smontaggio e rimontaggio di apparecchi d</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Smontaggio e rimontaggio di apparecchi d . . .		1	42,50	42,50	
						3,00% 42,50
<b>IE.011 - Fornitura e posa di presa CEE 17, grado</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa di presa CEE 17, grado . . .		1	2,46	2,46	
						3,00% 2,46
<b>PR.7C - Fornitura e posa in opera di tubo in PVC</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC . . .		1	41,27	41,27	
						3,00% 41,27
<b>18.5.2.4 - Fornitura e collocazione di conduttori i</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e collocazione di conduttori i . . .		1	289,99	289,99	
						3,00% 289,99
<b>IE.034 - Punto luce semplice, deviato, commutato,</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Punto luce semplice, deviato, commutato, . . .		1	133,09	133,09	
						3,00% 133,09
<b>IE.036 - Presa di corrente bipolare bipasso 2x10/</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Presa di corrente bipolare bipasso 2x10/ . . .		1	39,51	39,51	
						3,00% 39,51
<b>14.1.11.1 - Punto presa di corrente bipasso 2x10/16</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 . . .		1	13,92	13,92	
						3,00% 13,92
<b>14.1.21 - Punto presa d'antenna televisiva di</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Punto presa d'antenna televisiva di . . .		1	23,00	23,00	
						3,00% 23,00
<b>IE.006 - Collegamento equipotenziale di masse est</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Collegamento equipotenziale di masse est . . .		1	2,47	2,47	
						3,00% 2,47
<b>IE.015 - Fornitura e posa di apparecchi di illumi</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa di apparecchi di illumi . . .		1	2,40	2,40	
						3,00% 2,40
<b>IE.008 - Sovraprezzo per gruppo di emergenza per</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Sovraprezzo per gruppo di emergenza per . . .		1	3,98	3,98	
						3,00% 3,98
<b>IE.017 - Armadio componibile altezza 1400 mm, in</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Armadio componibile altezza 1400 mm, in . . .		1	13,23	13,23	
						3,00% 13,23
<b>IE.018 - Armadio componibile per alloggiamento mo</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Armadio componibile per alloggiamento mo . . .		1	4,15	4,15	

						3,00%	4,15
<b>14.6.1 - Campanello elettrico per porta</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Campanello elettrico per porta . . .		1	6,48	6,48	3,00%	6,48
<b>IE.005 - Maggior onere per custodie fino a tre pu</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Maggior onere per custodie fino a tre pu . . .		1	2,44	2,44	3,00%	2,44
<b>PR.7B - Fornitura e posa in opera di tubo in PVC</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC . . .		1	110,23	110,23	3,00%	110,23
<b>QQ.156 - Termoprogrammatore elettronico settima-</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Termoprogrammatore elettronico settima- . . .		1	2,59	2,59	3,00%	2,59
<b>IE.011 - Fornitura e posa di presa CEE 17, grado</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e posa di presa CEE 17, grado . . .		1	2,46	2,46	3,00%	2,46
<b>IE.037 - Smontaggio e rimontaggio di apparecchi d</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Smontaggio e rimontaggio di apparecchi d . . .		1	35,60	35,60	3,00%	35,60
<b>PR.7C - Fornitura e posa in opera di tubo in PVC</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC . . .		1	28,71	28,71	3,00%	28,71
<b>18.5.2.4 - Fornitura e collocazione di conduttori i</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e collocazione di conduttori i . . .		1	184,43	184,43	3,00%	184,43
<b>18.5.2.4 - Fornitura e collocazione di conduttori i</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e collocazione di conduttori i . . .		1	35,93	35,93	3,00%	35,93
<b>IE.034 - Punto luce semplice, deviato, commutato,</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Punto luce semplice, deviato, commutato, . . .		1	54,07	54,07	3,00%	54,07
<b>IE.006 - Collegamento equipotenziale di masse est</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Collegamento equipotenziale di masse est . . .		1	2,47	2,47	3,00%	2,47
<b>IE.015 - Fornitura e posa di apparecchi di illumi</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e posa di apparecchi di illumi . . .		1	2,40	2,40	3,00%	2,40
<b>IE.008 - Sovraprezzo per gruppo di emergenza per</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Sovraprezzo per gruppo di emergenza per . . .		1	67,61	67,61	3,00%	67,61
<b>IE.028 - Quadro per apparecchiature elettriche, f</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Quadro per apparecchiature elettriche, f . . .		1	13,46	13,46	3,00%	13,46
<b>IE.017 - Armadio componibile altezza 1400 mm, in</b>							



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Armadio componibile altezza 1400 mm, in . . .		1	13,23	13,23	
						3,00% 13,23
<b>IE.018 - Armadio componibile per alloggiamento mo</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Armadio componibile per alloggiamento mo . . .		1	4,15	4,15	
						3,00% 4,15
<b>IE.005 - Maggior onere per custodie fino a tre pu</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Maggior onere per custodie fino a tre pu . . .		1	3,13	3,13	
						3,00% 3,13
<b>PR.7B - Fornitura e posa in opera di tubo in PVC</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC . . .		1	14,89	14,89	
						3,00% 14,89
<b>IE.011 - Fornitura e posa di presa CEE 17, grado</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa di presa CEE 17, grado . . .		1	2,46	2,46	
						3,00% 2,46
<b>IE.037 - Smontaggio e rimontaggio di apparecchi d</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Smontaggio e rimontaggio di apparecchi d . . .		1	14,35	14,35	
						3,00% 14,35
<b>PR.7C - Fornitura e posa in opera di tubo in PVC</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC . . .		1	6,76	6,76	
						3,00% 6,76
<b>IE.022 - Interruttore automatico magnetotermico,</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Interruttore automatico magnetotermico, . . .		1	4,98	4,98	
						3,00% 4,98
<b>IE.023 - Interruttore automatico magnetotermico,</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Interruttore automatico magnetotermico, . . .		1	8,16	8,16	
						3,00% 8,16
<b>IE.024 - Interruttore automatico magnetotermico,</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Interruttore automatico magnetotermico, . . .		1	53,84	53,84	
						3,00% 53,84
<b>IE.025 - Interruttore automatico magnetotermico d</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Interruttore automatico magnetotermico d . . .		1	26,71	26,71	
						3,00% 26,71
<b>IE.026 - Interruttore automatico magnetotermico d</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Interruttore automatico magnetotermico d . . .		1	122,03	122,03	
						3,00% 122,03
<b>IE.030 - Fornitura e posa in opera di cavidotto i</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di cavidotto i . . .		1	19,40	19,40	
						3,00% 19,40
<b>18.5.2.5 - Fornitura e collocazione di conduttori i</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e collocazione di conduttori i . . .		1	0,94	0,94	
						2,99% 0,94
<b>18.5.2.6 - Fornitura e collocazione di conduttori i</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e collocazione di conduttori i . . .		1	9,91	9,91	

						3,00%	9,91
<b>18.5.2.7 - Fornitura e collocazione di conduttori i</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e collocazione di conduttori i . . .		1	8,34	8,34	3,00%	8,34
<b>18.5.2.8 - Fornitura e collocazione di conduttori i</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e collocazione di conduttori i . . .		1	21,18	21,18	3,00%	21,18
<b>18.5.2.9 - Fornitura e collocazione di conduttori i</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e collocazione di conduttori i . . .		1	40,94	40,94	3,00%	40,94
<b>7.1.1 - Fornitura di opere in ferro in profilati</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura di opere in ferro in profilati . . .		1	98,10	98,10	4,00%	98,10
<b>7.1.2 - Fornitura di opere in ferro in profilati</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura di opere in ferro in profilati . . .		1	57,60	57,60	4,00%	57,60
<b>7.1.3 - Posa in opera di opere in ferro di cui a</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Posa in opera di opere in ferro di cui a . . .		1	23,00	23,00	4,00%	23,00
<b>15.4.6.1 - Fornitura e collocazione di tubi di ferr</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e collocazione di tubi di ferr . . .		1	232,06	232,06	4,00%	232,06
<b>IA.001 - Gruppo attacco motopompa VVFF.</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
						1,62%	3,64
<b>IA.002 - Fornitura e posa di cassetta UNI 45</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
						1,63%	11,15
<b>IA.019 - Fornitura e posa cassetta UNI70-</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
						1,62%	5,50
<b>IA.005 - Pannello ottico</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
						1,63%	5,83
<b>IA.006 - Fornitura e posa in opera di cartello se</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Fornitura e posa in opera di cartello se . . .		1	6,59	6,59	4,00%	6,59
<b>IC.004 - Aspiratore di tipo centrifugo costruito</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Aspiratore di tipo centrifugo costruito . . .		1	21,34	21,34	4,00%	21,34
<b>IC.005 - Canalizzazione in lamiera zincata a sezi</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Canalizzazione in lamiera zincata a sezi . . .		1	11,64	11,64	4,00%	11,64
<b>IC.007 - Valvola di ventilazione DN 200 in acciai</b>							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo		
	Valvola di ventilazione DN 200 in acciai . . .		1	1,94	1,94	4,00%	1,94

IA.008 - Gruppo di spinta 2x20+7,5CV.						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 309,35
IA.007 - Fornitura e posa in opera di accessori p						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Fornitura e posa in opera di accessori p . . .						1 13,05 13,05
						2,00% 13,05
IA.017 - Pulsante a rottura di vetro						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 2,84
IA.018 - Fornitura e posa in opera di campana						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 2,71
IE.038 - Cavo multifunzione						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,62% 31,35
IA.015 - Fornitura e posa di rilevatore di fumo						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 21,75
15.4.6.1 - Fornitura e collocazione di tubi di ferr						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Fornitura e collocazione di tubi di ferr . . .						1 40,61 40,61
						4,00% 40,61
IA.002 - Fornitura e posa di cassetta UNI 45						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 11,15
IA.005 - Pannello ottico						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 4,67
IA.006 - Fornitura e posa in opera di cartello se						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Fornitura e posa in opera di cartello se . . .						1 6,59 6,59
						4,00% 6,59
IC.004 - Aspiratore di tipo centrifugo costruito						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Aspiratore di tipo centrifugo costruito . . .						1 10,67 10,67
						4,00% 10,67
IC.005 - Canalizzazione in lamiera zincata a sezi						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Canalizzazione in lamiera zincata a sezi . . .						1 11,64 11,64
						4,00% 11,64
IC.007 - Valvola di ventilazione DN 200 in acciai						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Valvola di ventilazione DN 200 in acciai . . .						1 1,94 1,94
						4,00% 1,94
IA.017 - Pulsante a rottura di vetro						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 2,27
IA.018 - Fornitura e posa in opera di campana						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 2,71
IA.012 - Fornitura in opera centrale antincendio						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 39,29
IA.015 - Fornitura e posa di rilevatore di fumo						

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 32,63
<b>IA.016 - Fornitura e posa combinatore telefonico</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 8,05
<b>15.4.6.1 - Fornitura e collocazione di tubi di ferr</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e collocazione di tubi di ferr . . .		1	25,77	25,77	4,00% 25,77
<b>IA.002 - Fornitura e posa di cassetta UNI 45</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 11,15
<b>IA.005 - Pannello ottico</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 7,00
<b>IA.006 - Fornitura e posa in opera di cartello se</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di cartello se . . .		1	5,96	5,96	4,00% 5,96
<b>IA.010 - Fornitura e posa in opera di porta antin</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di porta antin . . .		1	59,24	59,24	4,00% 59,24
<b>IC.004 - Aspiratore di tipo centrifugo costruito</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Aspiratore di tipo centrifugo costruito . . .		1	10,67	10,67	4,00% 10,67
<b>IC.005 - Canalizzazione in lamiera zincata a sezi</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Canalizzazione in lamiera zincata a sezi . . .		1	11,64	11,64	4,00% 11,64
<b>IC.007 - Valvola di ventilazione DN 200 in acciai</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Valvola di ventilazione DN 200 in acciai . . .		1	1,94	1,94	4,00% 1,94
<b>IA.017 - Pulsante a rottura di vetro</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 3,41
<b>IA.018 - Fornitura e posa in opera di campana</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,62% 3,61
<b>IA.015 - Fornitura e posa di rilevatore di fumo</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 32,63
<b>IA.005 - Pannello ottico</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 8,17
<b>IA.018 - Fornitura e posa in opera di campana</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
						1,63% 4,52
<b>15.4.1.2 - Fornitura e collocazione di punto acqua</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e collocazione di punto acqua . . .		1	13,44	13,44	4,00% 13,44
<b>15.1.5 - Fornitura e collocazione di lavabo a col</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	

Fornitura e collocazione di lavabo a col . . .				1	47,79	47,79	4,00%	47,79
<b>15.1.8 - Fornitura e collocazione di vaso igienic</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Fornitura e collocazione di vaso igienic . . .				1	18,03	18,03	4,00%	18,03
<b>15.1.5 - Fornitura e collocazione di lavabo a col</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Fornitura e collocazione di lavabo a col . . .				1	11,95	11,95	4,00%	11,95
<b>15.1.8 - Fornitura e collocazione di vaso igienic</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Fornitura e collocazione di vaso igienic . . .				1	9,02	9,02	4,00%	9,02
<b>15.3.3 - Fornitura e collocazione di mobile WC at</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Fornitura e collocazione di mobile WC at . . .				1	60,92	60,92	4,00%	60,92
<b>15.3.4 - Fornitura e collocazione di lavabo ergon</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Fornitura e collocazione di lavabo ergon . . .				1	70,64	70,64	4,00%	70,64
<b>15.1.5 - Fornitura e collocazione di lavabo a col</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Fornitura e collocazione di lavabo a col . . .				1	11,95	11,95	4,00%	11,95
<b>15.1.8 - Fornitura e collocazione di vaso igienic</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Fornitura e collocazione di vaso igienic . . .				1	9,02	9,02	4,00%	9,02
<b>15.3.3 - Fornitura e collocazione di mobile WC at</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Fornitura e collocazione di mobile WC at . . .				1	60,92	60,92	4,00%	60,92
<b>15.3.4 - Fornitura e collocazione di lavabo ergon</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Fornitura e collocazione di lavabo ergon . . .				1	70,64	70,64	4,00%	70,64
<b>15.1.5 - Fornitura e collocazione di lavabo a col</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Fornitura e collocazione di lavabo a col . . .				1	35,84	35,84	4,00%	35,84
<b>15.3.3 - Fornitura e collocazione di mobile WC at</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Fornitura e collocazione di mobile WC at . . .				1	60,92	60,92	4,00%	60,92
<b>15.3.4 - Fornitura e collocazione di lavabo ergon</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Fornitura e collocazione di lavabo ergon . . .				1	70,64	70,64	4,00%	70,64
<b>2.2.1.3 - Tramezzi con laterizi forati e malta cem</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Tramezzi con laterizi forati e malta cem . . .				1	23,26	23,26	4,00%	23,26
<b>5.9 - Rivestimento di pareti con piastrelle di</b>								
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo			
Rivestimento di pareti con piastrelle di . . .				1	133,02	133,02	4,00%	133,02

<b>8.2.1 - Fornitura e posa in opera di serramenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di serramenti . . .		1	198,58	198,58	
						4,00% 198,58
<b>8.6.2 - Fornitura e posa in opera di serramenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di serramenti . . .		1	210,53	210,53	
						4,00% 210,53
<b>8.10.1 - Fornitura e posa in opera di serramenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di serramenti . . .		1	65,07	65,07	
						4,00% 65,07
<b>8.14 - Fornitura e posa in opera di vetri termo</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di vetri termo . . .		1	11,70	11,70	
						4,00% 11,70
<b>9.12 - Intonaco interno premiscelato, dello spe</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Intonaco interno premiscelato, dello spe . . .		1	17,30	17,30	
						4,00% 17,30
<b>11.1 - Tinteggiatura con pittura lavabile di re</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Tinteggiatura con pittura lavabile di re . . .		1	15,76	15,76	
						4,00% 15,76
<b>21.1.17 - Rimozione di infissi interni od esterni</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Rimozione di infissi interni od esterni . . .		1	14,18	14,18	
						4,00% 14,18
<b>21.1.26 - Trasporto alle pubbliche discariche del</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Trasporto alle pubbliche discariche del . . .		1	23,59	23,59	
						4,00% 23,59
<b>21.1.25 - Rimozione di apparecchi igienico - sanit</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Rimozione di apparecchi igienico - sanit . . .		1	5,26	5,26	
						4,00% 5,26
<b>21.1.4 - Demolizione di tramezzi di qualsiasi nat</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Demolizione di tramezzi di qualsiasi nat . . .		1	19,84	19,84	
						4,00% 19,84
<b>21.8.1 - Smontaggio, riparazione (con sostituzion</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Smontaggio, riparazione (con sostituzion . . .		1	69,73	69,73	
						4,00% 69,73
<b>2.2.1.1 - Tramezzi con laterizi forati e malta cem</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Tramezzi con laterizi forati e malta cem . . .		1	33,39	33,39	
						4,00% 33,39
<b>9.1 - Intonaco civile per interni dello spesso</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Intonaco civile per interni dello spesso . . .		1	53,48	53,48	
						4,00% 53,48
<b>9.4 - Strato di finitura per interni su superf</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Strato di finitura per interni su superf . . .		1	32,38	32,38	
						4,00% 32,38
<b>IA.010 - Fornitura e posa in opera di porta antin</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	

Fornitura e posa in opera di porta antin . . .		1	59,24	59,24	4,00%	59,24
<b>2.2.1.3 - Tramezzi con laterizi forati e malta cem</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Tramezzi con laterizi forati e malta cem . . .		1	11,72	11,72	4,00%	11,72
<b>5.9 - Rivestimento di pareti con piastrelle di</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Rivestimento di pareti con piastrelle di . . .		1	75,79	75,79	4,00%	75,79
<b>8.2.1 - Fornitura e posa in opera di serramenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Fornitura e posa in opera di serramenti . . .		1	164,76	164,76	4,00%	164,76
<b>8.6.2 - Fornitura e posa in opera di serramenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Fornitura e posa in opera di serramenti . . .		1	210,53	210,53	4,00%	210,53
<b>8.10.1 - Fornitura e posa in opera di serramenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Fornitura e posa in opera di serramenti . . .		1	80,56	80,56	4,00%	80,56
<b>8.14 - Fornitura e posa in opera di vetri termo</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Fornitura e posa in opera di vetri termo . . .		1	11,70	11,70	4,00%	11,70
<b>9.12 - Intonaco interno premiscelato, dello spe</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Intonaco interno premiscelato, dello spe . . .		1	17,82	17,82	4,00%	17,82
<b>11.1 - Tinteggiatura con pittura lavabile di re</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Tinteggiatura con pittura lavabile di re . . .		1	16,95	16,95	4,00%	16,95
<b>21.1.17 - Rimozione di infissi interni od esterni</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Rimozione di infissi interni od esterni . . .		1	4,93	4,93	4,00%	4,93
<b>21.1.26 - Trasporto alle pubbliche discariche del</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Trasporto alle pubbliche discariche del . . .		1	8,21	8,21	4,00%	8,21
<b>21.1.25 - Rimozione di apparecchi igienico - sanit</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Rimozione di apparecchi igienico - sanit . . .		1	4,51	4,51	4,00%	4,51
<b>21.1.4 - Demolizione di tramezzi di qualsiasi nat</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Demolizione di tramezzi di qualsiasi nat . . .		1	6,77	6,77	4,00%	6,77
<b>21.8.1 - Smontaggio, riparazione (con sostituzion</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Smontaggio, riparazione (con sostituzion . . .		1	79,69	79,69	4,00%	79,69
<b>21.1.6 - Demolizione di pavimenti e rivestimenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Demolizione di pavimenti e rivestimenti . . .		1	13,20	13,20	4,00%	13,20

<b>2.2.1.1 - Tramezzi con laterizi forati e malta cem</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Tramezzi con laterizi forati e malta cem . . .		1	37,94	37,94	
						4,00% 37,94
<b>9.1 - Intonaco civile per interni dello spesso</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Intonaco civile per interni dello spesso . . .		1	60,78	60,78	
						4,00% 60,78
<b>9.4 - Strato di finitura per interni su superf</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Strato di finitura per interni su superf . . .		1	36,79	36,79	
						4,00% 36,79
<b>IA.010 - Fornitura e posa in opera di porta antin</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di porta antin . . .		1	118,49	118,49	
						4,00% 118,49
<b>2.2.1.3 - Tramezzi con laterizi forati e malta cem</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Tramezzi con laterizi forati e malta cem . . .		1	15,38	15,38	
						4,00% 15,38
<b>5.9 - Rivestimento di pareti con piastrelle di</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Rivestimento di pareti con piastrelle di . . .		1	75,79	75,79	
						4,00% 75,79
<b>8.2.1 - Fornitura e posa in opera di serramenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di serramenti . . .		1	164,76	164,76	
						4,00% 164,76
<b>8.6.2 - Fornitura e posa in opera di serramenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di serramenti . . .		1	210,53	210,53	
						4,00% 210,53
<b>8.10.1 - Fornitura e posa in opera di serramenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di serramenti . . .		1	80,56	80,56	
						4,00% 80,56
<b>8.14 - Fornitura e posa in opera di vetri termo</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di vetri termo . . .		1	11,70	11,70	
						4,00% 11,70
<b>9.12 - Intonaco interno premiscelato, dello spe</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Intonaco interno premiscelato, dello spe . . .		1	23,55	23,55	
						4,00% 23,55
<b>11.1 - Tinteggiatura con pittura lavabile di re</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Tinteggiatura con pittura lavabile di re . . .		1	20,41	20,41	
						4,00% 20,41
<b>21.1.17 - Rimozione di infissi interni od esterni</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Rimozione di infissi interni od esterni . . .		1	8,55	8,55	
						4,00% 8,55
<b>21.1.26 - Trasporto alle pubbliche discariche del</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Trasporto alle pubbliche discariche del . . .		1	14,23	14,23	
						4,00% 14,23
<b>21.1.25 - Rimozione di apparecchi igienico - sanit</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	



Rimozione di apparecchi igienico - sanit . . .		1	4,51	4,51	4,00%	4,51
<b>21.1.4 - Demolizione di tramezzi di qualsiasi nat</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Demolizione di tramezzi di qualsiasi nat . . .		1	17,02	17,02	4,00%	17,02
<b>21.8.1 - Smontaggio, riparazione (con sostituzion</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Smontaggio, riparazione (con sostituzion . . .		1	65,75	65,75	4,00%	65,75
<b>21.1.6 - Demolizione di pavimenti e rivestimenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Demolizione di pavimenti e rivestimenti . . .		1	13,20	13,20	4,00%	13,20
<b>2.2.1.1 - Tramezzi con laterizi forati e malta cem</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Tramezzi con laterizi forati e malta cem . . .		1	41,92	41,92	4,00%	41,92
<b>9.1 - Intonaco civile per interni dello spesso</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Intonaco civile per interni dello spesso . . .		1	70,93	70,93	4,00%	70,93
<b>9.4 - Strato di finitura per interni su superf</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Strato di finitura per interni su superf . . .		1	42,94	42,94	4,00%	42,94
<b>IA.010 - Fornitura e posa in opera di porta antin</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Fornitura e posa in opera di porta antin . . .		1	59,24	59,24	4,00%	59,24
<b>IM.001 - Fornitura e posa in opera di muratura di</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Fornitura e posa in opera di muratura di . . .		1	6,42	6,42	4,00%	6,42
<b>IM.001 - Fornitura e posa in opera di muratura di</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Fornitura e posa in opera di muratura di . . .		1	94,65	94,65	4,00%	94,65
<b>2.2.1.3 - Tramezzi con laterizi forati e malta cem</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Tramezzi con laterizi forati e malta cem . . .		1	23,30	23,30	4,00%	23,30
<b>5.9 - Rivestimento di pareti con piastrelle di</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Rivestimento di pareti con piastrelle di . . .		1	41,04	41,04	4,00%	41,04
<b>8.10.1 - Fornitura e posa in opera di serramenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Fornitura e posa in opera di serramenti . . .		1	27,89	27,89	4,00%	27,89
<b>9.12 - Intonaco interno premiscelato, dello spe</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Intonaco interno premiscelato, dello spe . . .		1	46,14	46,14	4,00%	46,14
<b>11.1 - Tinteggiatura con pittura lavabile di re</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Tinteggiatura con pittura lavabile di re . . .		1	6,95	6,95	4,00%	6,95

<b>21.1.25 - Rimozione di apparecchi igienico - sanit</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Rimozione di apparecchi igienico - sanit . . .		1	2,26	2,26	
						4,01% 2,26
<b>21.1.4 - Demolizione di tramezzi di qualsiasi nat</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Demolizione di tramezzi di qualsiasi nat . . .		1	6,30	6,30	
						4,00% 6,30
<b>21.8.1 - Smontaggio, riparazione (con sostituzion</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Smontaggio, riparazione (con sostituzion . . .		1	28,89	28,89	
						4,00% 28,89
<b>21.1.6 - Demolizione di pavimenti e rivestimenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Demolizione di pavimenti e rivestimenti . . .		1	1,26	1,26	
						4,01% 1,26
<b>1.1.6.2 - Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi . . .		1	0,186	0,186	
						4,01% 0,186
<b>IA.010 - Fornitura e posa in opera di porta antin</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di porta antin . . .		1	59,24	59,24	
						4,00% 59,24
<b>21.1.5.1 - Demolizione di muratura di qualsiasi tip</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Demolizione di muratura di qualsiasi tip . . .		1	15,54	15,54	
						4,00% 15,54
<b>2.2.1.1 - Tramezzi con laterizi forati e malta cem</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Tramezzi con laterizi forati e malta cem . . .		1	27,83	27,83	
						4,00% 27,83
<b>9.1 - Intonaco civile per interni dello spesso</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Intonaco civile per interni dello spesso . . .		1	44,58	44,58	
						4,00% 44,58
<b>9.4 - Strato di finitura per interni su superf</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Strato di finitura per interni su superf . . .		1	26,99	26,99	
						4,00% 26,99
<b>11.1 - Tinteggiatura con pittura lavabile di re</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Tinteggiatura con pittura lavabile di re . . .		1	10,34	10,34	
						4,00% 10,34
<b>8.16 - Fornitura e collocazione di porta intern</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e collocazione di porta intern . . .		1	49,48	49,48	
						4,00% 49,48
<b>8.1.1 - Fornitura e posa in opera di serramenti</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di serramenti . . .		1	33,31	33,31	
						4,00% 33,31
<b>8.13.2 - Fornitura e posa in opera di lastre di v</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
	Fornitura e posa in opera di lastre di v . . .		1	2,56	2,56	
						4,00% 2,56
<b>SA.01 - Carpenteria metallica, per strutture por</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	

Carpenteria metallica, per strutture por . . .		1	729,00	729,00	3,00%	729,00
<b>SA.02 - Sistemazione scale emergenza A con ripre</b>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unit.	Importo	
Sistemazione scale emergenza A con ripre . . .		1	150,00	150,00	3,00%	150,00
<b>TOTALE</b>						<b>9.718,60</b>

## 15. VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

La valutazione del rumore sui luoghi di lavoro, in fase preventiva, potrà essere svolta sulla base delle previsioni dei livelli di emissione sonora delle attrezzature di lavoro con le modalità descritte all'art. 103 del D. Lgs. 81/2008 e sarà pertanto parte integrante della valutazione dei rischi effettuata dall'impresa esecutrice (POS) ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 81/2008.

Come in precedenza accennato infatti, l'art. 103 del D. Lgs. 81/2008 cita testualmente che: *“L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.”*

Pertanto, ferme restando le disposizioni di legge per il datore di lavoro dell'impresa appaltante che dovrà comunque produrre una valutazione di esposizione professionale al rumore, seguono delle tabelle presuntive con le attività, i relativi livelli di emissione sonora e la durata ipotizzabile di esposizione di ciascun lavoratore con riferimento a studi statistici (come ad es. le tab. del CPT di Torino) e tendenti ad indicare le mansioni maggiormente soggette alle esposizioni acustiche, in modo tale da fornire indicazioni per la mappatura del rumore, lasciando comunque all'impresa appaltante l'onere di tale valutazione a seconda delle macchine ed attrezzature in suo possesso.

Per evidenziare in modo semplice le azioni da intraprendere a seguito della valutazione dei rischi si riporta una tabella riepilogativa che, suddivisa per "categorie" di rilevazione, dà l'indicazione generica delle azioni da intraprendere.

<b>Livello di esposizione quotidiana</b>	<b>Categoria</b>
Lex,d < 80 dB (A)	<b>NESSUNA</b>
Lex,d 80 - 85 dB (A) e peak level = 135dB (C)	<b>1° FASCIA</b>
Lex,d 85,1 - 87 dB (A) e peak level = 137dB (C)	<b>2° FASCIA</b>
Lex,d > 87 dB (A) e peak level = 140dB (C)	<b>3° FASCIA</b>

L'obbligo di **informazione e formazione** scatta a partire da una esposizione di 80 dBA (valore inferiore di azione), infatti l'art. 195 “Informazione e formazione dei lavoratori” del D. Lgs. n. 81/2008 sancisce che:

*“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.”*

L'obbligo di **fornire i mezzi di protezione personale** a partire da 80dBA è invece sancito dall'art. 193 “Uso dei dispositivi di protezione individuali” del D. Lgs. n. 81/2008. Tale art. recita che:

**1.** In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

Studio Tecnico Ing. Orazio Urso Via Sciare Spoto n° 4 Aci S. Antonio Catania

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

**2.** Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.

La **sorveglianza sanitaria** viene effettuata a partire da 85 dBA (da 80 dBA su richiesta del lavoratore o su disposizione del Medico Competente) così come previsto dall'art. 196 "Sorveglianza sanitaria":

**1.** Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

**2.** La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

## **16. ALLEGATI AL PSC**

Si riporta in allegato al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento la seguente documentazione:

*Schede di sicurezza relative alle singole fasi operative.*
